

30SEP2020



INFORME DE GESTIÓN para Comité Ejecutivo FECHITRI

Gustavo Svane

triatlonchile

INDICE

- A. Proyectos
- B. Equipo técnico
- C. Desarrollo del Proyecto
- D. Información general del Proyecto
- E. Visión general de los recursos
- F. Conclusión

ACTUAL

Santiago PATCO Pan American Cup

Fecha: Noviembre 2020

Sede: Santiago, Chile



FUTUROS

Valdivia PATCO Pan American Cup

Fecha: Febrero 2021

Sede: Valdivia, Chile



Concepción PATCO Middle Distance

Fecha: Febrero 2021

Sede: Concepción, Chile



Santiago PATCO Pan American Cup

Fecha: Noviembre 2021

Sede: Santiago, Chile

Juegos Panamericanos Santiago 2023

ITU World Cup Chile



B EQUIPO TÉCNICO

Felipe Van de Wyngard – Gerente General

Nicolás Pávez – Gerente Técnico

Jaime Guzmán –Eventos

Carol Rojas – Gerente Administración y Finanzas

Jaime Opazo - Comunicaciones

Rodrigo Gonzalez – Coordinador Técnico

Daniel Rioseco – Asistente de Finanzas

Gustavo Svane – Eventos Internacionales



DESARROLLO DEL PROYECTO

Con el avance de las tareas, se establecieron 754 tareas a distribuir entre los recursos.

Se ha dinamizado el trabajo a través de una plataforma común de trabajo, en una carpeta de Google Drive de acceso a todo el equipo.

Se ha realizado una reunión con el DT de la prueba de Santiago, y se ha incorporado a las áreas de trabajo, para su seguimiento.

Las reuniones del equipo se han intensificado, y se llevan diariamente, con programación previa; y se realiza una reunión quincenal con todo el equipo.

Cada semana se realizan las minutas para una comprensión detallada de los tratamientos de las tareas.

Cada semana se realizan reuniones con el Presidente y el Gerente para optimizar los avances de los proyectos.



DESARROLLO DEL PROYECTO

Nombre de tarea	% completad	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
LUGAR DE COMPETENCIA				
Mapa genérico de la sede (Google Earth)	62%	jue 3/9/20	vie 20/11/20	SVANE;GUZMAN
Planificación detallada de sitio	22%	lun 14/9/20	vie 9/10/20	SVANE;GUZMAN
Plan de despliegue de equipamiento FOP	40%	lun 14/9/20	vie 9/10/20	GUZMAN
Plan de configuración de la zona de transición	82%	lun 14/9/20	vie 9/10/20	SVANE;GUZMAN
Plan para motocicletas	80%	lun 14/9/20	vie 23/10/20	SVANE;GUZMAN
Preparaciones para condiciones de calor	25%	lun 14/9/20	vie 9/10/20	SVANE;GUZMAN
Plan de contingencia	50%	lun 14/9/20	lun 12/10/20	SVANE;GUZMAN
Actualizaciones del clima / Pronóstico		lun 14/9/20	vie 9/10/20	OPAZO
Plan de servicios VIP		lun 14/9/20	vie 9/10/20	ROJAS
Programa diario de actividades de la competencia (DRS)	90%	lun 14/9/20	vie 9/10/20	SVANE
Plan de evaluación de riesgo de ruta	56%	mié 16/9/20	mar 6/10/20	GUZMAN
Plan de operación marina	94%	mié 16/9/20	mar 13/10/20	SVANE;GUZMAN
Plan de calidad del agua	25%	mié 16/9/20	mar 13/10/20	VANDE
Plan medico	70%	mié 16/9/20	vie 30/10/20	SVANE;GUZMAN
Agenda provisional de eventos	75%	mié 16/9/20	mié 23/9/20	SVANE;GUZMAN
Plan de señalización de ruta		jue 17/9/20	vie 23/10/20	GUZMAN
Plano de vallado y barreras		jue 17/9/20	vie 23/10/20	GUZMAN
Visita técnica a sede		vie 18/9/20	vie 20/11/20	SVANE;GUZMAN;PAVEZ;GONZALEZ;OPAZO
Plan de comunicación		mar 29/9/20	vie 9/10/20	SVANE;GUZMAN
Plan de gestion de trafico		mar 29/9/20	vie 16/10/20	GUZMAN
Plan de desarmado de la sede		mié 30/9/20	vie 16/10/20	GUZMAN
Plan de armado de la sede		lun 5/10/20	vie 30/10/20	GUZMAN
Plan de acreditación		mar 6/10/20	jue 12/11/20	SVANE
Plan de evacuación		vie 6/11/20	vie 13/11/20	SVANE;GUZMAN
ADMINISTRACIÓN				
Plan protocolo COVID-19	65%	jue 3/9/20	vie 2/10/20	SVANE
Estructura comité organizador (COL)	58%	vie 11/9/20	vie 16/10/20	VANDE
Tramitación de permisos avales de Intendencia y Municipalidad	30%	lun 14/9/20	jue 24/9/20	GUZMAN;VANDE
Tramitación de permisos corte de tránsito SEREMI y Carabineros	30%	lun 14/9/20	jue 24/9/20	GUZMAN;VANDE
Tramitación de permisos de Armada	30%	lun 14/9/20	jue 24/9/20	GUZMAN;VANDE
Presupuesto global de la serie - Cash Flow		mar 15/9/20	dom 22/11/20	ROJAS
Contrato seguros		mar 29/9/20	lun 19/10/20	ROJAS
Plan de alimentación de atletas		mar 20/10/20	dom 22/11/20	PAVEZ
INFRAESTRUCTURA DE COMPETENCIA				
Equipamiento de competencias	26%	lun 7/9/20	vie 13/11/20	GUZMAN
COMUNICACIONES				
Plan de promoción del evento	9%	jue 17/9/20	dom 22/11/20	OPAZO
Contrato con patrocinadores		lun 21/9/20	jue 29/10/20	VANDE
Plan de branding y activación de marcas	10%	lun 19/10/20	dom 22/11/20	OPAZO
Plan de operaciones de medios		mar 20/10/20	lun 9/11/20	OPAZO
SERVICIOS A DEPORTISTAS				
Plan de entrenamiento de deportistas		jue 17/9/20	mié 30/9/20	PAVEZ
Plan de calculo de oleadas Age Groups		jue 17/9/20	mié 23/9/20	GONZALEZ
Plan de kit de atleta		vie 18/9/20	mié 18/11/20	PAVEZ
Plan de servicios para deportistas		lun 21/9/20	vie 13/11/20	GUZMAN;GONZALEZ;PAVEZ
Plan de alojamiento atletas Elite		mar 22/9/20	lun 5/10/20	PAVEZ
Plan de control de dopaje		mar 22/9/20	lun 28/9/20	VANDE
Registro de atletas Elite		mar 20/10/20	vie 20/11/20	PAVEZ
Plan armado de briefing		vie 6/11/20	jue 19/11/20	PAVEZ
IMAGEN DE COMPETENCIA				
Plan de sistema de sonido y video de la sede	9%	lun 21/9/20	vie 6/11/20	OPAZO
Plan de presentación del deporte en sede	15%	lun 21/9/20	vie 6/11/20	OPAZO
Plan de ceremonias de apertura y cierre		lun 9/11/20	vie 13/11/20	ROJAS
RECURSOS HUMANOS				
Plan de formación del personal	25%	mar 22/9/20	vie 2/10/20	GUZMAN
Reclutamiento de voluntarios	10%	mar 29/9/20	lun 9/11/20	GUZMAN
Reclutamiento y tareas de TOs	50%	lun 5/10/20	jue 15/10/20	SVANE
Servicios TOs	50%	lun 19/10/20	vie 23/10/20	SVANE
Boletín de noticias TOs		lun 26/10/20	vie 6/11/20	SVANE
TECNOLOGÍA DE COMPETENCIA				
Plan de tiempos y resultados		mar 6/10/20	vie 30/10/20	GUZMAN


D INFORMACION DEL PROYECTO

% COMPLETADO AL 30/09

35%

% COMPLETADO


Estado de todas las tareas de nivel superior.

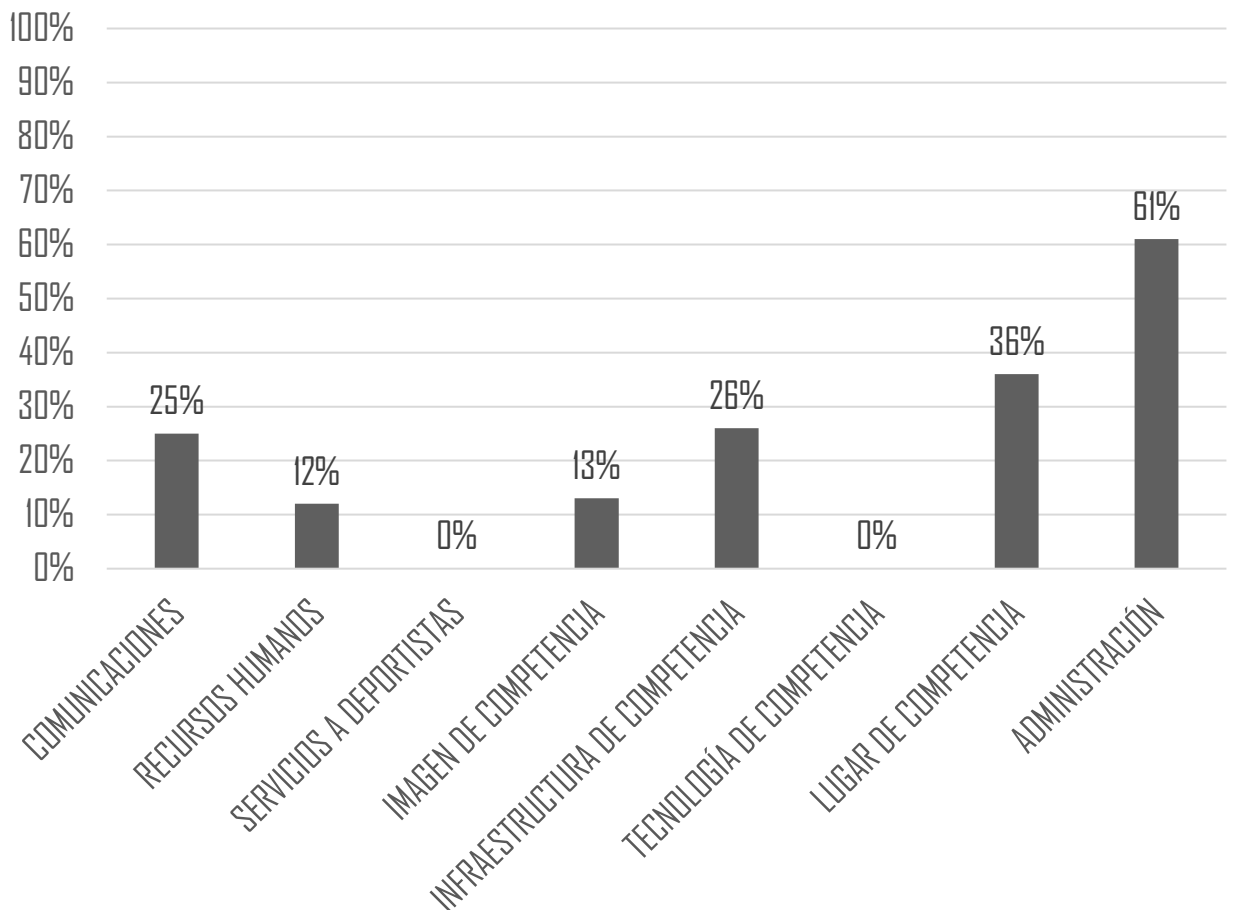

VISIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS


ESTADÍSTICAS DE RECURSOS

Estado de trabajo de todos los recursos de trabajo.

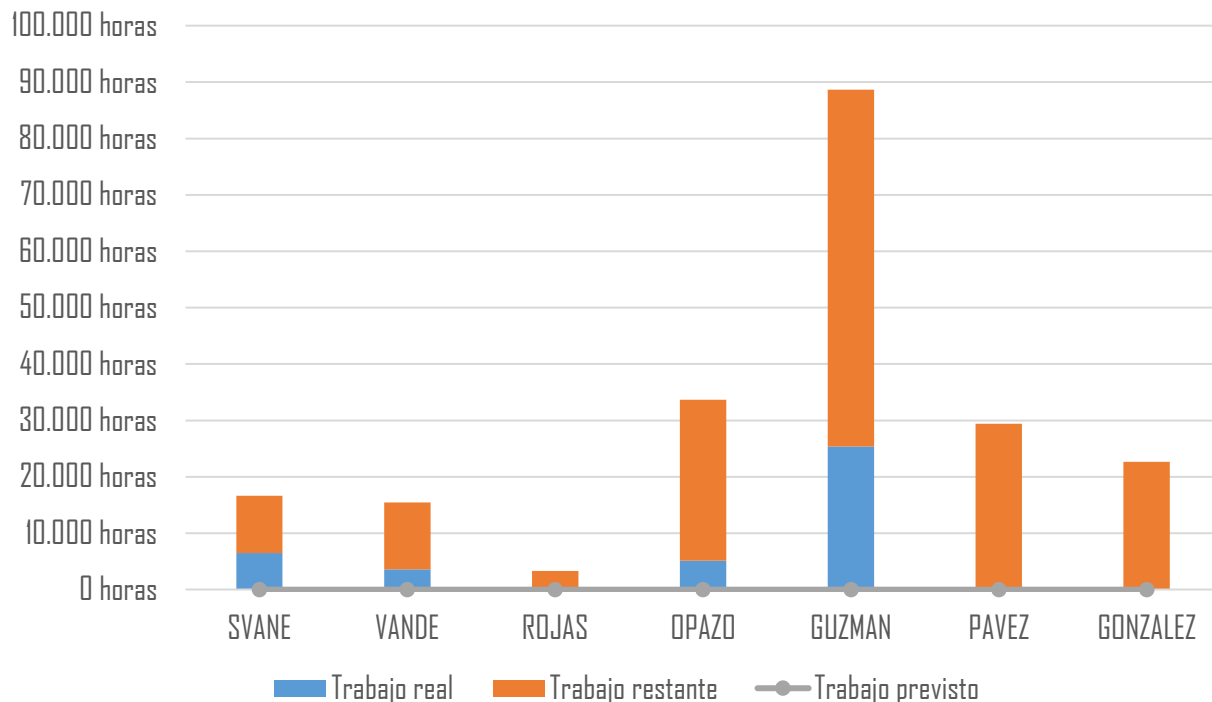

ESTADO DEL TRABAJO

% trabajo realizado por todos los recursos de trabajo.

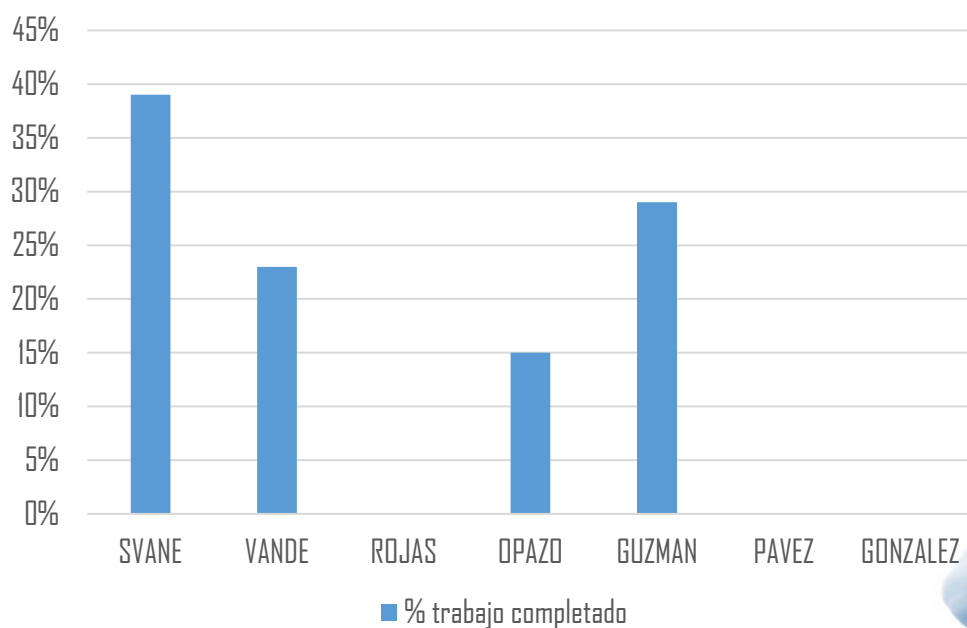

VISIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS

ESTADO DE LOS RECURSOS

Trabajo restante para todos los recursos de trabajo

Nombre	Comienzo	Fin	Trabajo restante
SVANE	jue 3/9/20	vie 20/11/20	10.154,54 horas
VANDE	lun 14/9/20	vie 20/11/20	11.857,12 horas
ROJAS	lun 14/9/20	dom 22/11/20	3.280 horas
OPAZO	lun 14/9/20	dom 22/11/20	28.546,76 horas
GUZMAN	jue 3/9/20	vie 20/11/20	63.294,53 horas
PAVEZ	jue 17/9/20	dom 22/11/20	29.384 horas
GONZALEZ	jue 17/9/20	vie 20/11/20	22.640 horas



CONCLUSIÓN

Próximos pasos

- ✓ Hacer un seguimiento de la situación actual, respecto a la pandemia.
- ✓ Realizar visitas técnicas en el lugar de competencia.
- ✓ Hacer las mediciones del circuito.
- ✓ Preparación del material de promoción.
- ✓ Ajustar las gestiones al presupuesto, y valorizar las tareas a realizar, para hacer un seguimiento de costos.





triatlonchile
