

30 OCT 2020



# INFORME DE GESTIÓN

## Asesoría Eventos ITU Chile

Gustavo Svane

triatlónchile

# INDICE

- A. Introducción.
- B. Proyectos.
- C. Objetivos.
- D. Avance de Proyectos.
- E. Estado de Tareas.
- F. Imagen.
- G. Próximos pasos



# INTRODUCCIÓN

Durante el inicio del año 2020 se generó el proyecto de realizar **eventos ITU** en diferentes sedes de Chile.

El objetivo era preparar el equipo de organización con vista a los **Juegos Panamericanos** de 2023.

El foco estaba centrado en crear una organización con **estándar internacional** de alto nivel profesional.

En ese sentido, se delinearon **estrategias de trabajo**, para incorporar la asesoría deportiva dentro del ámbito de la Federación, para poner en marcha los proyectos, preparara los recursos y colaborar con las diferentes organizadoras del país.

Por ello se aprobó la incorporación del **director de eventos ITU**, que se concretó en septiembre de 2020.





# PROYECTOS

Copa PATCO **Santiago** 2020 al 2023

Copa PATCO **Valdivia** 2021 al 2023

Campeonato PATCO **Concepción** 2021 al 2023

Organización de los Juegos Deportivos

**Panamericanos Santiago** 2023

**Copa Mundo** ITU (Juegos Olímpicos París 2024)



# OBJETIVOS

Promover la **participación** en la actividad deportiva.

Exponer al triatlón con un estándar **profesional** de **organización**.

Ayudar a **generar un impacto** turístico, social y económico, asociado al evento.

Posicionar a Chile en el **contexto mundial** del deporte,

Establecer Copas PATCO en Chile, con continuidad por períodos con **objetivos** Panamericanos y Olímpicos.

Dinamizar la convocatoria de **participación económica** de los patrocinadores, que potencien los objetivos federativos.

Aumentar el estándar de los eventos de Chile, que generen una **referencia de Organización** en la Región.

Generar una **organización consolidada** en producción de eventos.

Aumentar el número de eventos nacionales, generando un sistema de clasificación y ranking que **incrementen la participación** de competidores.

Fomentar un clima de **trabajo proactivo**, para beneficio de los atletas, staff, entrenadores y público participante.

Generar un programa de formación de **oficiales técnicos**.

Preparar la organización y los equipos de trabajo, con vista a los **Juegos Panamericanos** de Santiago 2023.

Proyectar **Copa Mundo ITU**, con la estructura legada de Santiago 2023.



# AVANCE DE PROYECTOS

Project en **Diagrama Gantt**.

Áreas principales:

- Lugar de competencia
- Administración
- Infraestructura de competencia
- Comunicaciones
- Servicios a deportistas
- Imagen de competencia
- Recursos humanos
- Tecnología de competencia

El desarrollo de las actividades fue distribuido en **754 tareas**.



# AVANCE DE PROYECTOS

## Copa Santiago 2020

Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
<b>LUGAR DE COMPETENCIA</b>				
Mapa genérico de la sede (Google Earth)	99%	jue 3/9/20	lun 5/10/20	SVANE;GUZMAN
Planificación detallada de sitio	87%	lun 14/9/20	mié 2/12/20	SVANE;GUZMAN
Plan de despliegue de equipamiento FOP	36%	lun 14/9/20	lun 30/11/20	GUZMAN
Plan de configuración de la zona de transición	75%	lun 14/9/20	lun 30/11/20	SVANE;GUZMAN
Plan para motocicletas	92%	lun 14/9/20	vie 23/10/20	SVANE;GUZMAN
Preparaciones para condiciones de calor	25%	lun 14/9/20	mié 9/12/20	SVANE;GUZMAN
Plan de contingencia	50%	lun 14/9/20	vie 11/12/20	SVANE;GUZMAN
Actualizaciones del clima / Pronóstico		lun 14/9/20	lun 14/12/20	OPAZO
Plan de servicios VIP	33%	lun 14/9/20	lun 14/12/20	ROJAS
Programa diario de actividades de la competencia (DRS)	100%	lun 14/9/20	vie 9/10/20	SVANE
Plan de evaluación de riesgo de ruta	60%	mié 16/9/20	vie 30/10/20	GUZMAN
Plan de operación marina	96%	mié 16/9/20	vie 6/11/20	SVANE;GUZMAN
Plan de calidad del agua	50%	mié 16/9/20	lun 14/12/20	VANDE
Plan medico	75%	mié 16/9/20	vie 30/10/20	SVANE;GUZMAN
Agenda provisional de eventos	100%	mié 16/9/20	mié 23/9/20	SVANE;GUZMAN
Plan de señalización de ruta		jue 17/9/20	lun 21/12/20	GUZMAN
Plano de vallado y barreras	67%	jue 17/9/20	lun 30/11/20	GUZMAN
Visita técnica a sede	74%	vie 18/9/20	lun 25/1/21	SVANE;GUZMAN;PAVEZ;GONZALEZ;OPAZO
Plan de comunicación		mar 29/9/20	lun 14/12/20	SVANE;GUZMAN
Plan de gestion de trafico		mar 29/9/20	vie 18/12/20	GUZMAN
Plan de armado de la sede		lun 5/10/20	vie 8/1/21	GUZMAN
Plan de acreditacion		mar 6/10/20	mié 30/12/20	SVANE
Plan de desarmado de la sede		vie 30/10/20	vie 18/12/20	GUZMAN
Plan de evacuación		vie 6/11/20	lun 11/1/21	SVANE;GUZMAN
<b>ADMINISTRACIÓN</b>				
Plan protocolo COVID-19	80%	jue 3/9/20	lun 30/11/20	SVANE
Estructura comité organizador (COL)	31%	vie 11/9/20	mié 16/12/20	VANDE
Tramitación de permisos avales de Intendencia y Municipalidad	80%	lun 14/9/20	vie 27/11/20	GUZMAN;VANDE
Tramitación de permisos corte de tránsito SEREMI y Carabineros	80%	lun 14/9/20	vie 27/11/20	GUZMAN;VANDE
Tramitación de permisos de Armada	80%	lun 14/9/20	vie 27/11/20	GUZMAN;VANDE
Presupuesto global de la serie - Cash Flow	75%	mar 15/9/20	dom 22/11/20	ROJAS
Contrato seguros		mar 29/9/20	vie 25/12/20	ROJAS
Plan de alimentación de atletas		mar 20/10/20	vie 22/1/21	PAVEZ
<b>INFRAESTRUCTURA DE COMPETENCIA</b>				
Equipamiento de competencias	25%	lun 7/9/20	lun 4/1/21	GUZMAN



# AVANCE DE PROYECTOS

## Copa Santiago 2020

Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
<b>COMUNICACIONES</b>				
Plan de promoción del evento	33%	jue 17/9/20	vie 22/1/21	OPAZO
Contrato con patrocinadores		lun 21/9/20	lun 4/1/21	VANDE
Plan de branding y activación de marcas	16%	lun 19/10/20	vie 22/1/21	OPAZO
Plan de operaciones de medios		mar 20/10/20	vie 29/1/21	OPAZO
<b>SERVICIOS A DEPORTISTAS</b>				
Plan de entrenamiento de deportistas		jue 17/9/20	lun 30/11/20	PAVEZ
Plan de calculo de oleadas Age Groups		jue 17/9/20	lun 30/11/20	GONZALEZ
Plan de kit de atleta		vie 18/9/20	vie 15/1/21	PAVEZ
Plan de servicios para deportistas		lun 21/9/20	vie 18/12/20	GUZMAN;GONZALEZ;PAVEZ
Plan armado de briefing		vie 6/11/20	mié 27/1/21	PAVEZ
Plan de alojamiento atletas Elite		lun 7/12/20	vie 18/12/20	PAVEZ
Plan de control de dopaje		lun 14/12/20	vie 18/12/20	VANDE
Registro de atletas Elite		mar 12/1/21	vie 22/1/21	PAVEZ
<b>IMAGEN DE COMPETENCIA</b>				
Plan de sistema de sonido y video de la sede	5%	lun 21/9/20	vie 8/1/21	OPAZO
Plan de presentación del deporte en sede	14%	lun 21/9/20	vie 8/1/21	OPAZO
Plan de ceremonias de apertura y cierre		lun 9/11/20	vie 15/1/21	ROJAS
<b>RECURSOS HUMANOS</b>				
Plan de formación del personal	25%	mar 22/9/20	vie 11/12/20	GUZMAN
Reclutamiento de voluntarios	4%	mar 29/9/20	vie 8/1/21	GUZMAN
Reclutamiento y tareas de TOs	9%	lun 9/11/20	lun 28/12/20	SVANE
Boletín de noticias TOs		vie 20/11/20	lun 18/1/21	SVANE
Servicios TOs	50%	lun 2/11/20	lun 28/12/20	SVANE
<b>TECNOLOGÍA DE COMPETENCIA</b>				
Plan de tiempos y resultados	50%	mar 6/10/20	vie 30/10/20	GUZMAN



# AVANCE DE PROYECTOS

## Copa Santiago 2020


### INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

% COMPLETADO

34%


% COMPLETADO

Estado de todas las tareas de nivel superior..

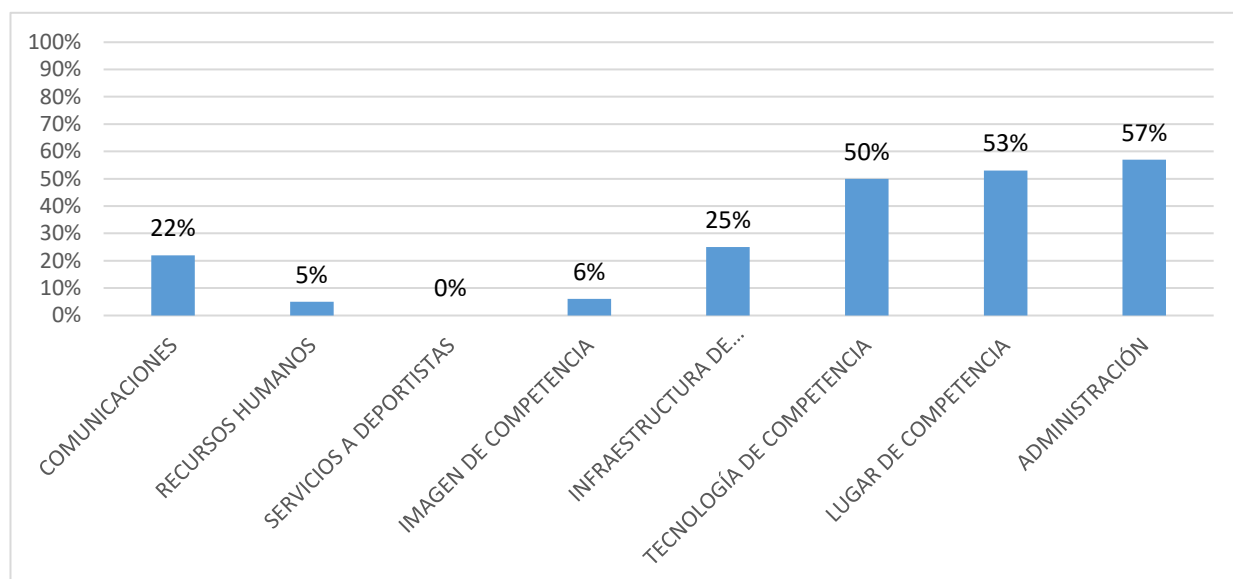

ESTADO DEL TRABAJO

% trabajo realizado por todos los recursos de trabajo.

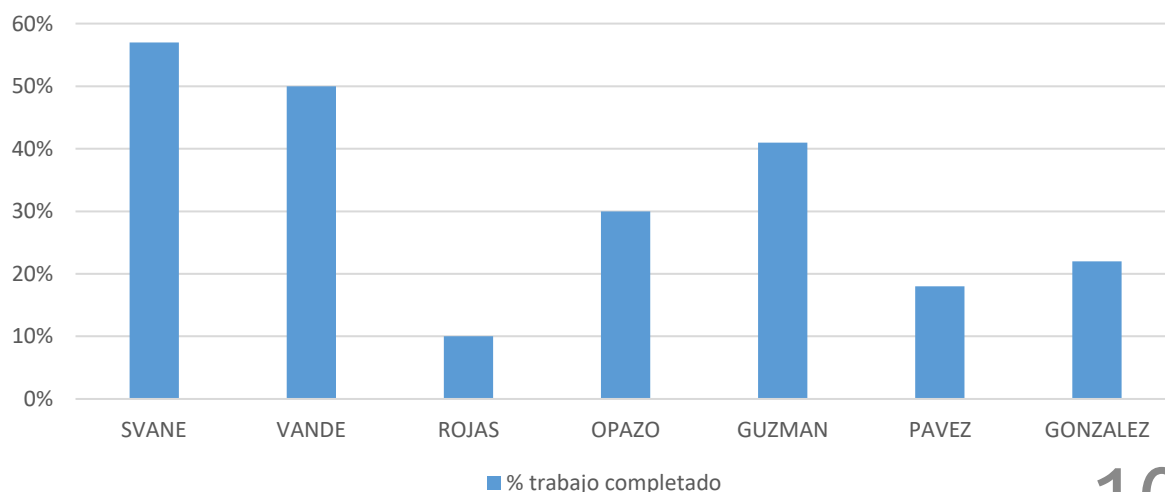

# AVANCE DE PROYECTOS

## Copa Valdivia 2020

Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
<b>LUGAR DE COMPETENCIA</b>				
Plan de armado de la sede		lun 5/10/20	vie 30/10/20	ZAPATA
Plan de despliegue de equipamiento FOP		lun 12/10/20	vie 6/11/20	ZAPATA
Plan de configuración de la zona de transición	50%	lun 12/10/20	vie 6/11/20	ZAPATA
Preparaciones para condiciones de calor		lun 12/10/20	vie 6/11/20	ZAPATA
Plan de evaluación de riesgo de ruta		lun 19/10/20	vie 6/11/20	ZAPATA
Actualizaciones del clima / Pronóstico		lun 12/10/20	vie 6/11/20	ZAPATA
Plan de servicios VIP	50%	lun 12/10/20	vie 6/11/20	ZAPATA
Programa diario de actividades de la competencia (DRS)	60%	lun 12/10/20	vie 6/11/20	SVANE
Plan de comunicación		mié 28/10/20	lun 9/11/20	ZAPATA
Planificación detallada de sitio		lun 19/10/20	vie 13/11/20	ZAPATA
Plan de operación marina	50%	lun 19/10/20	vie 13/11/20	ZAPATA
Plan de calidad del agua		lun 19/10/20	vie 13/11/20	ZAPATA
Plan de evacuación		vie 6/11/20	vie 13/11/20	ZAPATA
Plan de desarmado de la sede		mié 28/10/20	vie 13/11/20	ZAPATA
Plan de gestión de tráfico		mié 28/10/20	lun 16/11/20	ZAPATA
Plan para motocicletas	100%	lun 12/10/20	vie 20/11/20	ZAPATA
Agenda provisional de eventos	50%	lun 19/10/20	vie 20/11/20	ZAPATA
Plan de señalización de ruta		mar 20/10/20	mar 24/11/20	ZAPATA
Plano de vallado y barreras	50%	mar 20/10/20	mar 24/11/20	ZAPATA
Plan médico	30%	lun 19/10/20	mar 1/12/20	ZAPATA
Plan de acreditación		mar 6/10/20	vie 1/1/21	ZAPATA
Plan de contingencia		vie 13/11/20	lun 11/1/21	ZAPATA
Mapa genérico de la sede (Google Earth)	100%	jue 8/10/20	jue 14/1/21	ZAPATA
Visita técnica a sede		lun 30/11/20	lun 1/2/21	ZAPATA
<b>ADMINISTRACIÓN</b>				
Tramitación de permisos avales de Intendencia y Municipalidad	100%	lun 12/10/20	jue 22/10/20	ZAPATA
Tramitación de permisos corte de tránsito SEREMI y Carabineros	100%	lun 12/10/20	jue 22/10/20	ZAPATA
Tramitación de permisos de Armada	100%	lun 12/10/20	jue 22/10/20	ZAPATA
Plan protocolo COVID-19	100%	jue 8/10/20	vie 6/11/20	ZAPATA
Estructura comité organizador (COL)	50%	sáb 10/10/20	vie 13/11/20	ZAPATA
Contrato seguros		mié 28/10/20	mar 17/11/20	ZAPATA
Plan de alimentación de atletas		mar 20/10/20	dom 22/11/20	ZAPATA
Presupuesto global de la serie - Cash Flow	70%	lun 12/10/20	jue 17/12/20	ZAPATA
<b>INFRAESTRUCTURA DE COMPETENCIA</b>				
Equipamiento de competencias		vie 9/10/20	mié 16/12/20	ZAPATA

# AVANCE DE PROYECTOS

## Copa Valdivia 2020

Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
<b>COMUNICACIONES</b>				
Contrato con patrocinadores		lun 19/10/20	jue 29/10/20	ZAPATA
Plan de operaciones de medios		mar 20/10/20	lun 9/11/20	OPAZO
Plan de promoción del evento		lun 19/10/20	dom 22/11/20	OPAZO
Plan de branding y activación de marcas	40%	lun 19/10/20	dom 22/11/20	OPAZO
<b>SERVICIOS A DEPORTISTAS</b>				
Plan de control de dopaje		lun 19/10/20	vie 23/10/20	ZAPATA
Plan de calculo de oleadas Age Groups		lun 19/10/20	vie 23/10/20	ZAPATA
Plan de alojamiento atletas Elite		lun 19/10/20	vie 30/10/20	ZAPATA
Plan de entrenamiento de deportistas		lun 19/10/20	vie 30/10/20	ZAPATA
<i>Plan armado de briefing</i>		<i>vie 6/11/20</i>	<i>jue 19/11/20</i>	ZAPATA
Registro de atletas Elite		mar 20/10/20	vie 20/11/20	ZAPATA
Plan de kit de atleta		lun 19/10/20	mié 16/12/20	ZAPATA
Plan de servicios para deportistas		lun 19/10/20	mié 23/12/20	ZAPATA
<b>IMAGEN DE COMPETENCIA</b>				
Plan de sistema de sonido y video de la sede		lun 19/10/20	jue 3/12/20	OPAZO
Plan de presentación del deporte en sede		lun 19/10/20	jue 3/12/20	OPAZO
Plan de ceremonias de apertura y cierre		lun 9/11/20	mié 23/12/20	ZAPATA
<b>RECURSOS HUMANOS</b>				
Plan de formación del personal	50%	lun 2/11/20	lun 28/12/20	ZAPATA
Servicios TOs		lun 9/11/20	lun 28/12/20	SVANE
Boletín de noticias TOs		vie 20/11/20	lun 18/1/21	SVANE
Reclutamiento y tareas de TOs	4%	lun 9/11/20	jue 28/1/21	SVANE
Reclutamiento de voluntarios	70%	lun 23/11/20	vie 29/1/21	ZAPATA
<b>TECNOLOGÍA DE COMPETENCIA</b>				
Plan de tiempos y resultados		mar 6/10/20	lun 30/11/20	ZAPATA

# AVANCE DE PROYECTOS

## Copa Valdivia 2020


### INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

% COMPLETADO

6%


% COMPLETADO

Estado de todas las tareas de nivel superior.

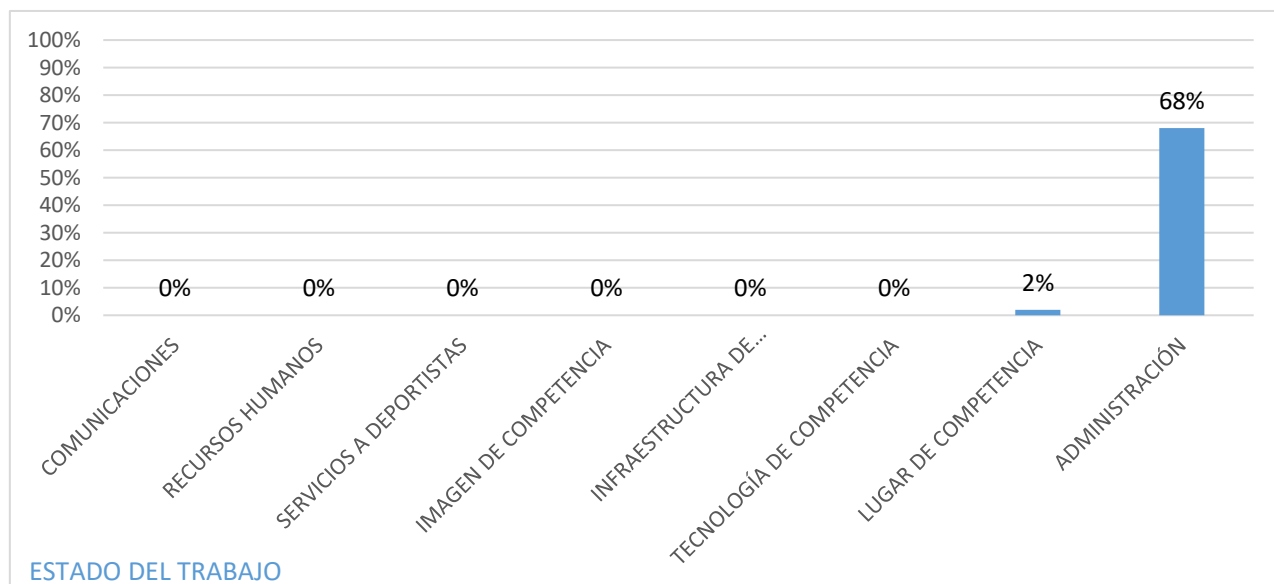

ESTADO DEL TRABAJO

% trabajo realizado por todos los recursos de trabajo.

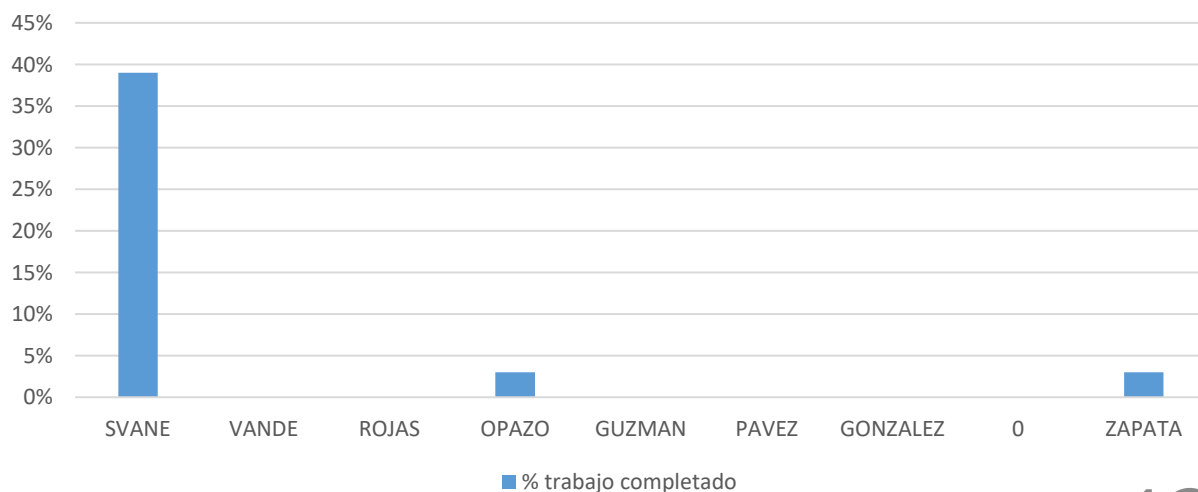

# AVANCE DE PROYECTOS

## Organigrama del proyecto:

- Felipe Van de Wyngard – Gerente
- Jaime Guzmán – Producción Técnica
- Nicolás Pávez – Servicios a Atletas
- Rodrigo Gonzalez – Servicio a Atletas
- Carol Rojas – Administración y Finanzas
- Jaime Opazo – Comunicación y Promoción
- Daniel Rioseco – Asistente de Finanzas
- Gustavo Svane – Director General del Proyecto



# ESTADO DE TAREAS



## INFORME ESTADO DE TAREAS Asesoría Eventos ITU Chile

Gustavo Svane

Triathlonchile

# ESTADO DE TAREAS

Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Recursos	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
<b>LUGAR DE COMPETENCIA</b>	<b>53%</b>	<b>3/9/2020</b>	<b>25/1/2021</b>						
Mapa genérico de la sede (Google Earth)	99%	3/9/2020	5/10/2020	SVANE;GUZMAN					
Planificación detallada de sitio	87%	14/9/2020	2/12/2020	SVANE;GUZMAN					
Plan de despliegue de equipamiento FOP	36%	14/9/2020	30/11/2020	GUZMAN					
Plan de configuración de la zona de transición	75%	14/9/2020	30/11/2020	SVANE;GUZMAN					
Plan para motocicletas	20%	14/9/2020	23/10/2020	SVANE;GUZMAN					
Preparaciones para condiciones de calor	25%	14/9/2020	9/12/2020	SVANE;GUZMAN					
Plan de contingencia	50%	14/9/2020	11/12/2020	SVANE;GUZMAN					
Actualizaciones del clima / Pronóstico	0%	14/9/2020	14/12/2020	OPAZO					
Plan de servicios VIP	33%	14/9/2020	14/12/2020	ROJAS					
Programa diario de actividades de la competencia (DRS)	100%	14/9/2020	9/10/2020	SVANE					
Plan de evaluación de riesgo de ruta	73%	16/9/2020	30/10/2020	GUZMAN					
Plan de operación marina	96%	16/9/2020	6/11/2020	SVANE;GUZMAN					
Plan de calidad del agua	50%	16/9/2020	14/12/2020	VANDE					
Plan medico	70%	16/9/2020	30/10/2020	SVANE;GUZMAN					
Agenda provisional de eventos	100%	16/9/2020	23/9/2020	SVANE;GUZMAN					
Plan de señalización de ruta	0%	17/9/2020	21/12/2020	GUZMAN					
Plano de vallado y barreras	67%	17/9/2020	30/11/2020	GUZMAN					
Visita técnica a sede	74%	18/9/2020	25/1/2021	EQUIPO					
Plan de comunicación	0%	29/9/2020	14/12/2020	SVANE;GUZMAN					
Plan de gestion de trafico	0%	29/9/2020	18/12/2020	GUZMAN					
Plan de armado de la sede	21%	5/10/2020	8/1/2021	GUZMAN					
Plan de acreditacion	0%	6/10/2020	30/12/2020	SVANE					
Plan de desarmado de la sede	0%	30/10/2020	18/12/2020	GUZMAN					
Plan de evacuación	0%	6/11/2020	11/1/2021	SVANE;GUZMAN					
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>57%</b>	<b>3/9/2020</b>	<b>22/1/2021</b>						
Plan protocolo COVID-19	80%	3/9/2020	30/11/2020	SVANE					
Estructura comité organizador (COL)	31%	11/9/2020	16/12/2020	VANDE					
<i>Tramitación de permisos de Armada</i>	<i>0%</i>	<i>14/9/2020</i>	<i>27/11/2020</i>	<i>VANDE</i>					
Presupuesto global de la serie - Cash Flow	75%	15/9/2020	22/11/2020	ROJAS					
Tramitación de permisos avales de Intendencia Metropolitana	50%	17/9/2020	16/12/2020	GUZMAN;VANDE					
Tramitación de permisos avales de Municipalidad Quinta Normal	50%	17/9/2020	16/12/2020	VANDE;GUZMAN[0%]					
Tramitación de permisos corte de tránsito SEREMI de Transporte	50%	17/9/2020	16/12/2020	GUZMAN[0%];VANDE					
Tramitación de permisos COCH	0%	17/9/2020	16/12/2020	VANDE;GUZMAN[0%]					
Tramitación de permisos corte de tránsito Carabineros	0%	17/9/2020	16/12/2020	VANDE;GUZMAN[0%]					
Contrato seguros	0%	29/9/2020	25/12/2020	ROJAS					
Plan de alimentación de atletas	0%	20/10/2020	22/1/2021	PAVEZ					



# ESTADO DE TAREAS

Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Recursos	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
<b>INFRAESTRUCTURA DE COMPETENCIA</b>	<b>25%</b>	<b>7/9/2020</b>	<b>4/1/2021</b>						
Equipamiento de competencias	25%	7/9/2020	4/1/2021	GUZMAN					
<b>COMUNICACIONES</b>	<b>22%</b>	<b>17/9/2020</b>	<b>29/1/2021</b>						
Plan de promoción del evento	33%	17/9/2020	22/1/2021	OPAZO					
Contrato con patrocinadores	0%	21/9/2020	4/1/2021	VANDE					
Plan de branding y activación de marcas	16%	19/10/2020	22/1/2021	OPAZO					
Plan de operaciones de medios	0%	20/10/2020	29/1/2021	OPAZO					
<b>SERVICIOS A DEPORTISTAS</b>	<b>0%</b>	<b>17/9/2020</b>	<b>27/1/2021</b>						
Plan de entrenamiento de deportistas	0%	17/9/2020	30/11/2020	PAVEZ					
Plan de calculo de oleadas Age Groups	0%	17/9/2020	30/11/2020	GONZALEZ					
Plan de kit de atleta	0%	18/9/2020	15/1/2021	PAVEZ					
Plan de servicios para deportistas	0%	21/9/2020	18/12/2020	GUZMAN;GONZALEZ; PAVEZ					
Plan armado de briefing	0%	6/11/2020	27/1/2021	PAVEZ					
Plan de alojamiento atletas Elite	0%	7/12/2020	18/12/2020	PAVEZ					
Plan de control de dopaje	0%	14/12/2020	18/12/2020	VANDE					
Registro de atletas Elite	0%	12/1/2021	22/1/2021	PAVEZ					
<b>IMAGEN DE COMPETENCIA</b>	<b>6%</b>	<b>21/9/2020</b>	<b>15/1/2021</b>						
Plan de sistema de sonido y video de la sede	5%	21/9/2020	8/1/2021	OPAZO					
Plan de presentación del deporte en sede	14%	21/9/2020	8/1/2021	OPAZO					
Plan de ceremonias de apertura y cierre	0%	9/11/2020	15/1/2021	ROJAS					
<b>TECNOLOGÍA DE COMPETENCIA</b>	<b>50%</b>	<b>6/10/2020</b>	<b>30/10/2020</b>						
Plan de tiempos y resultados	50%	6/10/2020	30/10/2020	GUZMAN					
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5%</b>	<b>3/9/2020</b>	<b>18/1/2021</b>						
Plan de formación del personal	25%	22/9/2020	11/12/2020	GUZMAN					
Reclutamiento de voluntarios	4%	29/9/2020	8/1/2021	GUZMAN					
Reclutamiento y tareas de TOs	9%	5/10/2020	11/12/2020	SVANE					
Boletín de noticias TOs	0%	26/10/2020	6/11/2020	SVANE					
Boletín de noticias TOs	0%	26/10/2020	8/1/2021	SVANE					
Servicios TOs	0%	2/11/2020	28/12/2020	SVANE					
Reclutamiento y tareas de TOs	0%	9/11/2020	28/12/2020	SVANE					
Boletín de noticias TOs	0%	20/11/2020	18/1/2021	SVANE					

	Tarea completada
	Tarea pendiente
	Tarea retrasada

# IMAGEN

Se trabajó en homologar la imagen de promoción de los eventos con el nuevo formato de imagen de **World Triathlon**: <https://www.triathlon.org/#>

Establecimos trabajar con la misma imagen la Copa de **Santiago**, de **Valdivia** y el Campeonato de **Concepción**.

Para ello se preparó un **plan de marketing integral** para todos los eventos.



**Santiago**  
Panamerican Cup





# PROXIMOS PASOS

Promoción del evento.

Consolidar la **imagen** de los eventos.

Incorporar la preparación del **Campeonato Concepción 2021**.

Compra de **equipamiento**.

Reuniones con proveedores.

Reuniones con **prensa**.

Reuniones con **organizadores** y **autoridades** de Valdivia y Concepción.



triatlonchile
