

04DIC2020



# INFORME DE GESTIÓN

## Asesoría Eventos ITU Chile

Gustavo Svane

triathlonchile

# INDICE

- A. Introducción.
- B. Proyectos.
- C. Objetivos.
- D. Avance de Proyectos.
- E. Estado de Tareas.
- F. Próximos pasos



# INTRODUCCIÓN

Estamos en etapa de **aprobación del protocolo COVID** creado para los eventos FECHITRI.

Para ello, todo el equipo de trabajo se ha concientizado en **optimizar la organización** para poder lograr que los eventos sean seguros y controlados.

Hemos intensificado las medidas de seguridad, implementando **controles por acreditación**, para limitar el acceso y circulación de personas.

Los trabajos de sustentabilidad acompañan este proceso, lo que nos garantiza que estaremos realizando eventos limpios que **marcarán huella** en el calendario de World Triathlon.





# PROYECTOS ACTUALES

[2021 America Triathlon Junior Cup Santiago](#)

[2021 American Triathlon Cup Santiago](#)

[2021 American Triathlon Cup and South American Championships Valdivia](#)

[2021 American Triathlon Middle Distance South American Championships Concepcion](#)

[2021 American Triathlon Cup Santiago](#)



# OBJETIVOS

Promover la **participación** en la actividad deportiva.

Exponer al triatlón con un estándar **profesional** de **organización**.

Ayudar a **generar un impacto** turístico, social y económico, asociado al evento.

Posicionar a Chile en el **contexto mundial** del deporte,

Establecer Copas PATCO en Chile, con continuidad por períodos con **objetivos** Panamericanos y Olímpicos.

Dinamizar la convocatoria de **participación económica** de los patrocinadores, que potencien los objetivos federativos.

Aumentar el estándar de los eventos de Chile, que generen una **referencia de Organización** en la Región.

Generar una **organización consolidada** en producción de eventos, con **alta exposición en sustentabilidad**.

Aumentar el número de eventos nacionales, generando un sistema de clasificación y ranking que **incrementen la participación** de competidores.

Fomentar un clima de **trabajo proactivo**, para beneficio de los atletas, staff, entrenadores y público participante.

Generar un programa de formación de **oficiales técnicos**. Preparar la organización y los equipos de trabajo, con vista a los **Juegos Panamericanos** de Santiago 2023.

Proyectar **Copa Mundo ITU**, con la estructura legada de Santiago 2023.





**Americas  
Triathlon**

## **American Triathlon Cup Santiago 2021**



# AVANCE DE PROYECTOS

## Copa Santiago 2021

Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
<b>LUGAR DE COMPETENCIA</b>					
Mapa genérico de la sede (Google Earth)	99%	23 días	jue 3/9/20	lun 5/10/20	GUZMAN;SVANE
Planificación detallada de sitio	87%	58 días	lun 14/9/20	mié 2/12/20	SVANE;GUZMAN
Plan de despliegue de equipamiento FOP	50%	56 días	lun 14/9/20	lun 30/11/20	GUZMAN
Plan de configuración de la zona de transición	99%	56 días	lun 14/9/20	lun 30/11/20	GUZMAN;SVANE
Plan para motocicletas	92%	30 días	lun 14/9/20	vie 23/10/20	GUZMAN;SVANE
Plan de armado de la sede	74%	70 días	lun 5/10/20	vie 8/1/21	GUZMAN
Preparaciones para condiciones de calor	25%	63 días	lun 14/9/20	mié 9/12/20	GUZMAN
Plan de evaluación de riesgo de ruta	99%	33 días	mié 16/9/20	vie 30/10/20	GUZMAN
Visita técnica a sede	74%	92 días	vie 18/9/20	lun 25/1/21	EQUIPO
Plan de comunicación		55 días	mar 29/9/20	lun 14/12/20	GUZMAN;SVANE
Plan de señalización de ruta	25%	68 días	jue 17/9/20	lun 21/12/20	GUZMAN
Plan de acreditación	100%	62 días	mar 6/10/20	mié 30/12/20	SVANE
Plan de contingencia	99%	65 días	lun 14/9/20	vie 11/12/20	SVANE;GUZMAN
Plan de operación marina	96%	38 días	mié 16/9/20	vie 6/11/20	GUZMAN;SVANE
Plan de calidad del agua	50%	64 días	mié 16/9/20	lun 14/12/20	VANDE
Actualizaciones del clima / Pronóstico		66 días	lun 14/9/20	lun 14/12/20	OPAZO
Plan de servicios VIP	33%	66 días	lun 14/9/20	lun 14/12/20	ROJAS
Plan de evacuación		47 días	vie 6/11/20	lun 11/1/21	GUZMAN;SVANE
Plan medico	88%	33 días	mié 16/9/20	vie 30/10/20	GUZMAN;SVANE
Plan de gestion de trafico		59 días	mar 29/9/20	vie 18/12/20	GUZMAN
Plan de desarmado de la sede		36 días	vie 30/10/20	vie 18/12/20	GUZMAN
Plano de vallado y barreras	67%	53 días	jue 17/9/20	lun 30/11/20	GUZMAN
Programa diario de actividades de la competencia (DRS)	100%	20 días	lun 14/9/20	vie 9/10/20	SVANE
Agenda provisional de eventos	100%	6 días	mié 16/9/20	mié 23/9/20	SVANE
<b>ADMINISTRACIÓN</b>					
Estructura comité organizador (COL)	46%	69 días	vie 11/9/20	mié 16/12/20	VANDE
Presupuesto global de la serie - Cash Flow	99%	50 días	mar 15/9/20	dom 22/11/20	ROJAS
Plan protocolo COVID-19	58%	86 días?	jue 3/9/20	jue 31/12/20	SVANE
Contrato seguros	50%	64 días	mar 29/9/20	vie 25/12/20	ROJAS
Tramitación de permisos avales de Intendencia Metropolitana	80%	65 días	jue 17/9/20	mié 16/12/20	GUZMAN;VANDE
Tramitación de permisos avales de Municipalidad Quinta Normal	80%	65 días	jue 17/9/20	mié 16/12/20	GUZMAN;VANDE
Tramitación de permisos corte de tránsito SEREMI de Transporte	80%	65 días	jue 17/9/20	mié 16/12/20	GUZMAN;VANDE
Tramitación de permisos COCH	80%	65 días	jue 17/9/20	mié 16/12/20	GUZMAN;VANDE
Tramitación de permisos corte de tránsito Carabineros	80%	65 días	jue 17/9/20	mié 16/12/20	GUZMAN;VANDE
Tramitación de permisos de Armada	80%	55 días	lun 14/9/20	vie 27/11/20	GUZMAN;VANDE
Plan de alimentación de atletas	50%	69 días	mar 20/10/20	vie 22/1/21	PAVEZ
<b>INFRAESTRUCTURA DE COMPETENCIA</b>					
Equipamiento de competencias	25%	86 días	lun 7/9/20	lun 4/1/21	GUZMAN

# AVANCE DE PROYECTOS

## Copa Santiago 2021

Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
<b>COMUNICACIONES</b>					
<b>Plan de promoción del evento</b>	<b>42%</b>	<b>92 días</b>	jue 17/9/20	vie 22/1/21	OPAZO
Contrato con patrocinadores		76 días	lun 21/9/20	lun 4/1/21	VANDE
<b>Plan de branding y activación de marcas</b>	<b>32%</b>	<b>70 días</b>	lun 19/10/20	vie 22/1/21	OPAZO
<b>Plan de operaciones de medios</b>		<b>74 días</b>	mar 20/10/20	vie 29/1/21	OPAZO
<b>RECURSOS HUMANOS</b>					
Plan de formación del personal	25%	59 días	mar 22/9/20	vie 11/12/20	GUZMAN
Reclutamiento y tareas de TOs	<b>40%</b>	36 días	lun 9/11/20	lun 28/12/20	SVANE
Servicios TOs	40%	41 días	lun 2/11/20	lun 28/12/20	SVANE
Boletín de noticias TOs		42 días	vie 20/11/20	lun 18/1/21	SVANE
<b>Reclutamiento de voluntarios</b>		<b>74 días</b>	mar 29/9/20	vie 8/1/21	GUZMAN
<b>SERVICIOS A DEPORTISTAS</b>					
<b>Plan de servicios para deportistas</b>	<b>49%</b>	<b>65 días</b>	lun 21/9/20	vie 18/12/20	<b>GONZALEZ;PAVEZ</b>
<b>Plan de kit de atleta</b>	<b>50%</b>	<b>86 días</b>	vie 18/9/20	vie 15/1/21	PAVEZ
Registro de atletas Elite	50%	9 días	mar 12/1/21	vie 22/1/21	PAVEZ
Plan de alojamiento atletas Elite	50%	10 días	lun 7/12/20	vie 18/12/20	PAVEZ
Plan de control de dopaje		5 días	lun 14/12/20	vie 18/12/20	VANDE
<b>Plan armado de briefing</b>		<b>59 días</b>	vie 6/11/20	mié 27/1/21	PAVEZ
<b>Plan de entrenamiento de deportistas</b>	<b>50%</b>	<b>53 días</b>	jue 17/9/20	lun 30/11/20	PAVEZ
<b>Plan de calculo de oleadas Age Groups</b>	<b>99%</b>	<b>53 días</b>	jue 17/9/20	lun 30/11/20	GONZALEZ
<b>IMAGEN DE COMPETENCIA</b>					
<b>Plan de ceremonias de apertura y cierre</b>	<b>52%</b>	<b>50 días</b>	lun 9/11/20	vie 15/1/21	ROJAS
<b>Plan de sistema de sonido y video de la sede</b>	<b>90%</b>	<b>80 días</b>	lun 21/9/20	vie 8/1/21	OPAZO
<b>Plan de presentación del deporte en sede</b>	<b>14%</b>	<b>80 días</b>	lun 21/9/20	vie 8/1/21	OPAZO
<b>TECNOLOGÍA DE COMPETENCIA</b>					
<b>Plan de tiempos y resultados</b>	<b>83%</b>	<b>19 días</b>	mar 6/10/20	vie 30/10/20	<b>GUZMAN</b>



# AVANCE DE PROYECTOS

## Copa Santiago 2021

### SEGUIMIENTO DE PERMISOS

Entidad	Contacto	Acciones actuales	Observaciones	Fecha Limite
COCH	Miguel Angel Mujica	Recepcionada	Contacto con IND	12/11/2020
COCH	Jose Antonio Giordano	Recepciona email Jose Antonio Giordano	Contacto con IND	12/11/2020
Ministerio del Deporte	Jefe Alto Rendimiento Matias Valdecantos	Email pendiente respuesta	Recibió protocolo COVID de FN	16/11/2020
Municipalidad Quinta Normal	Martha Diaz: secretmarthacormudep@gmail.com Oscar Mendoza: cormudepmendoza@gmail.com Control Cormudep: controlcormudep@gmail.com	Ingresado timbrado (sin respuesta a la fecha)	En espera de carta de autorización de evento por Depto Deportes	21/11/2020
SEREMI de Salud			Recepción protocolo COVID de FN - Autorización y consultar Valdecantos	9/12/2020
SEREMI de Transporte	<a href="mailto:Ofiparteseremitrm@mtt.gob.cl">Ofiparteseremitrm@mtt.gob.cl</a>	Se entrega codigo de ingreso 30327 en conjunto con area de deporte Municipalidad Quinta Normal	Recepción protocolo COVID de FN - Autorización Municipal - Juan Antonio Rojas	28/12/2020
Intendencia Metropolitana	Felipe Guevara Stephens	Respuesta fue enviada a correo de FV	<b>Presentación solicitud FECHITRI - AUTORIZACION</b>	28/12/2020
Carabineros		Sin gestión	Llega autorización de Intendencia Met	15/1/2021

# AVANCE DE PROYECTOS

## Copa Santiago 2021


### INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

% COMPLETADO

49%


% COMPLETADO

Estado de todas las tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga clic en el gráfico y actualice el nivel de esquema en la Lista de campos.

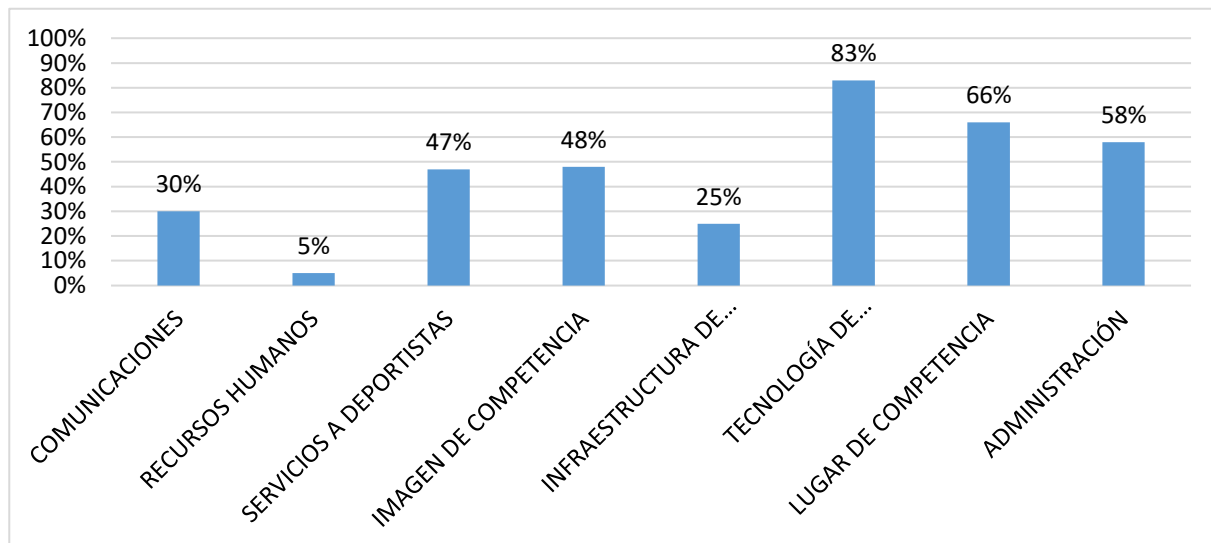

ESTADO DEL TRABAJO

% trabajo realizado por todos los recursos de trabajo.

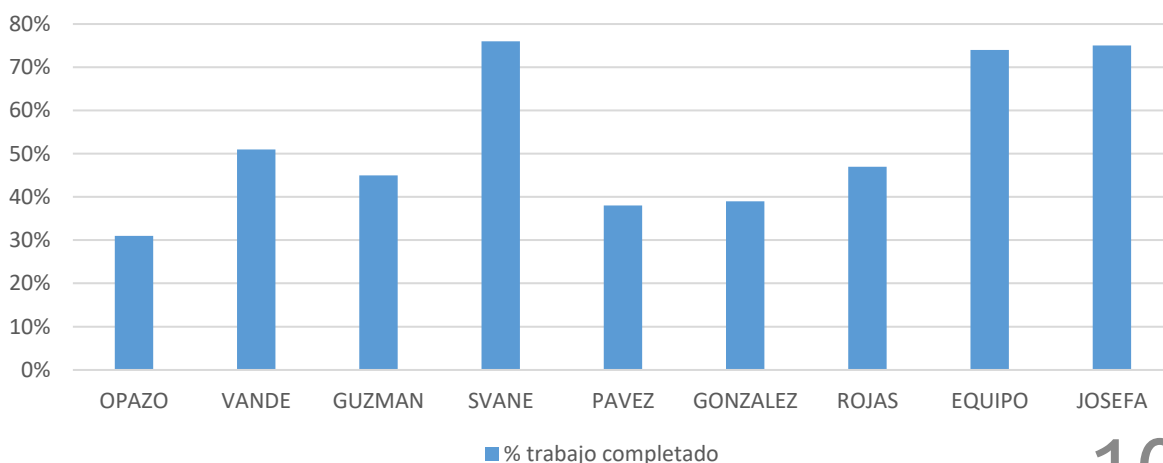

# AVANCE DE PROYECTOS



**Americas  
Triathlon**

**American Triathlon Cup and  
South American Championship**

**Valdivia 2021**



# AVANCE DE PROYECTOS

## Copa Valdivia 2021

Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
<b>LUGAR DE COMPETENCIA</b>					
Mapa genérico de la sede (Google Earth)	99%	190,25 días?	jue 8/10/20	jue 10/12/20	ZAPATA
Planificación detallada de sitio	100%	20 días	lun 19/10/20	vie 13/11/20	ZAPATA
Plan de despliegue de equipamiento FOP		20 días	lun 12/10/20	vie 6/11/20	ZAPATA
Plan de configuración de la zona de transición		20 días	lun 12/10/20	vie 6/11/20	ZAPATA
Plan para motocicletas	100%	30 días	lun 12/10/20	vie 20/11/20	ZAPATA
Plan de armado de la sede		20 días?	lun 5/10/20	vie 30/10/20	ZAPATA
Preparaciones para condiciones de calor		20 días	lun 12/10/20	vie 6/11/20	ZAPATA
Plan de evaluación de riesgo de ruta	50%	15 días	lun 19/10/20	vie 6/11/20	ZAPATA
Visita técnica a sede		46 días	lun 30/11/20	lun 1/2/21	ZAPATA
Plan de comunicación		9 días	mié 28/10/20	lun 9/11/20	ZAPATA
Plan de señalización de ruta		27 días	mar 20/10/20	mar 24/11/20	ZAPATA
Plan de acreditación		65 días	mar 6/10/20	vie 1/1/21	ZAPATA
Plan de contingencia		43 días	vie 13/11/20	lun 11/1/21	ZAPATA
Plan de operación marina	67%	20 días	lun 19/10/20	vie 13/11/20	ZAPATA
Plan de calidad del agua		20 días	lun 19/10/20	vie 13/11/20	ZAPATA
Actualizaciones del clima / Pronóstico		20 días	lun 12/10/20	vie 6/11/20	ZAPATA
Plan de servicios VIP	100%	20 días	lun 12/10/20	vie 6/11/20	ZAPATA
Plan de evacuación		6 días	vie 6/11/20	vie 13/11/20	ZAPATA
Plan medico	50%	33 días	lun 19/10/20	mar 1/12/20	ZAPATA
Plan de gestión de tráfico		14 días	mié 28/10/20	lun 16/11/20	ZAPATA
Plan de desarmado de la sede		13 días	mié 28/10/20	vie 13/11/20	ZAPATA
Plano de vallado y barreras	50%	27 días	mar 20/10/20	mar 24/11/20	ZAPATA
Programa diario de actividades de la competencia (DRS)	100%	20 días	lun 12/10/20	vie 6/11/20	SVANE
Agenda provisional de eventos		25 días	lun 19/10/20	vie 20/11/20	ZAPATA
<b>ADMINISTRACIÓN</b>					
Estructura comité organizador (COL)	50%	26 días	sáb 10/10/20	vie 13/11/20	ZAPATA
Presupuesto global de la serie - Cash Flow		50 días	lun 12/10/20	jue 17/12/20	ZAPATA
Plan protocolo COVID-19	38%	83 días	jue 8/10/20	vie 29/1/21	ZAPATA
Contrato seguros		15 días	mié 28/10/20	mar 17/11/20	ZAPATA
Tramitación de permisos avales de Intendencia y Municipalidad	100%	9 días	lun 12/10/20	jue 22/10/20	ZAPATA
Tramitación de permisos corte de tránsito SEREMI y Carabineros	100%	9 días	lun 12/10/20	jue 22/10/20	ZAPATA
Tramitación de permisos de Armada		9 días	lun 12/10/20	jue 22/10/20	ZAPATA
Plan de alimentación de atletas		25 días	mar 20/10/20	dom 22/11/20	ZAPATA
<b>INFRAESTRUCTURA DE COMPETENCIA</b>					
Equipamiento de competencias	50%	50 días	vie 9/10/20	mié 16/12/20	ZAPATA

# AVANCE DE PROYECTOS

## Copa Valdivia 2021

Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
<b>COMUNICACIONES</b>					
Plan de promoción del evento	50%	26 días	lun 19/10/20	dom 22/11/20	OPAZO
Contrato con patrocinadores		9 días	lun 19/10/20	jue 29/10/20	ZAPATA
Plan de branding y activación de marcas		26 días	lun 19/10/20	dom 22/11/20	OPAZO
Plan de operaciones de medios		15 días	mar 20/10/20	lun 9/11/20	OPAZO
<b>RECURSOS HUMANOS</b>					
Plan de formación del personal		42 días	lun 2/11/20	lun 28/12/20	ZAPATA
Reclutamiento de voluntarios		50 días	lun 23/11/20	vie 29/1/21	ZAPATA
Servicios TOs		37 días	lun 9/11/20	lun 28/12/20	SVANE
Boletín de noticias TOs		43 días	vie 20/11/20	lun 18/1/21	SVANE
Reclutamiento y tareas de TOs	4%	60 días	lun 9/11/20	jue 28/1/21	SVANE
<b>SERVICIOS A DEPORTISTAS</b>					
Plan de servicios para deportistas	73%	49 días	lun 19/10/20	mié 23/12/20	ZAPATA
Plan de kit de atleta	99%	44 días	lun 19/10/20	mié 16/12/20	ZAPATA
Registro de atletas Elite		24 días	mar 20/10/20	vie 20/11/20	ZAPATA
Plan de alojamiento atletas Elite		10 días	lun 19/10/20	vie 30/10/20	ZAPATA
Plan de control de dopaje		5 días	lun 19/10/20	vie 23/10/20	ZAPATA
Plan armado de briefing		10 días	vie 6/11/20	jue 19/11/20	ZAPATA
Plan de entrenamiento de deportistas		10 días	lun 19/10/20	vie 30/10/20	ZAPATA
Plan de calculo de oleadas Age Groups		5 días	lun 19/10/20	vie 23/10/20	ZAPATA
<b>IMAGEN DE COMPETENCIA</b>					
Plan de ceremonias de apertura y cierre		34 días	lun 9/11/20	mié 23/12/20	ZAPATA
Plan de sistema de sonido y video de la sede		35 días	lun 19/10/20	jue 3/12/20	OPAZO
Plan de presentación del deporte en sede		35 días	lun 19/10/20	jue 3/12/20	OPAZO
<b>TECNOLOGÍA DE COMPETENCIA</b>					
Plan de tiempos y resultados	100%	41 días	mar 6/10/20	lun 30/11/20	ZAPATA

# AVANCE DE PROYECTOS

## Copa Valdivia 2021


### INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

% COMPLETADO

42%


% COMPLETADO

Estado de todas las tareas de nivel superior.

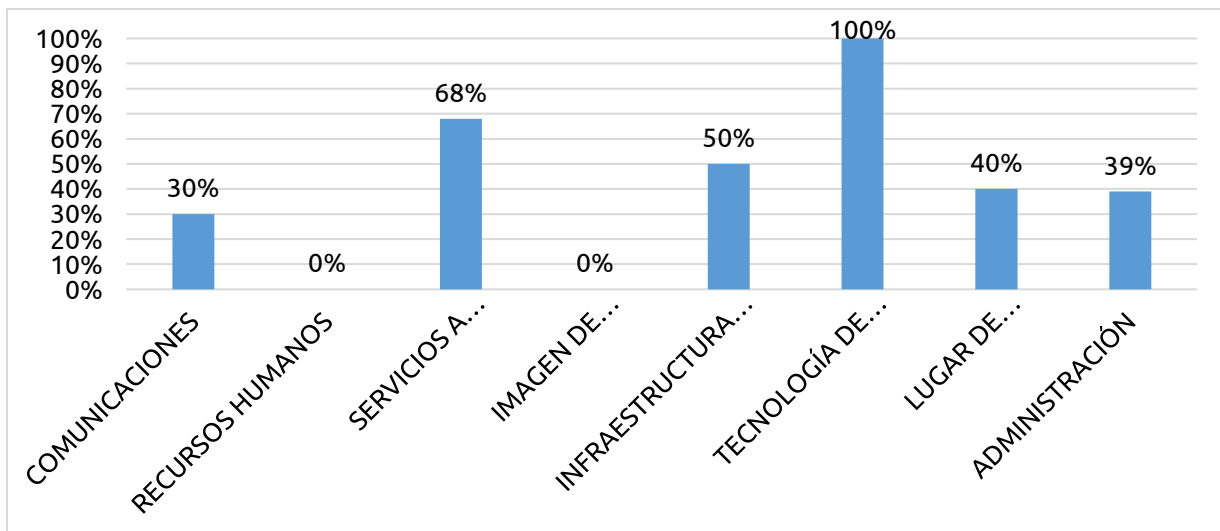

ESTADO DEL TRABAJO

% trabajo realizado por todos los recursos de trabajo.

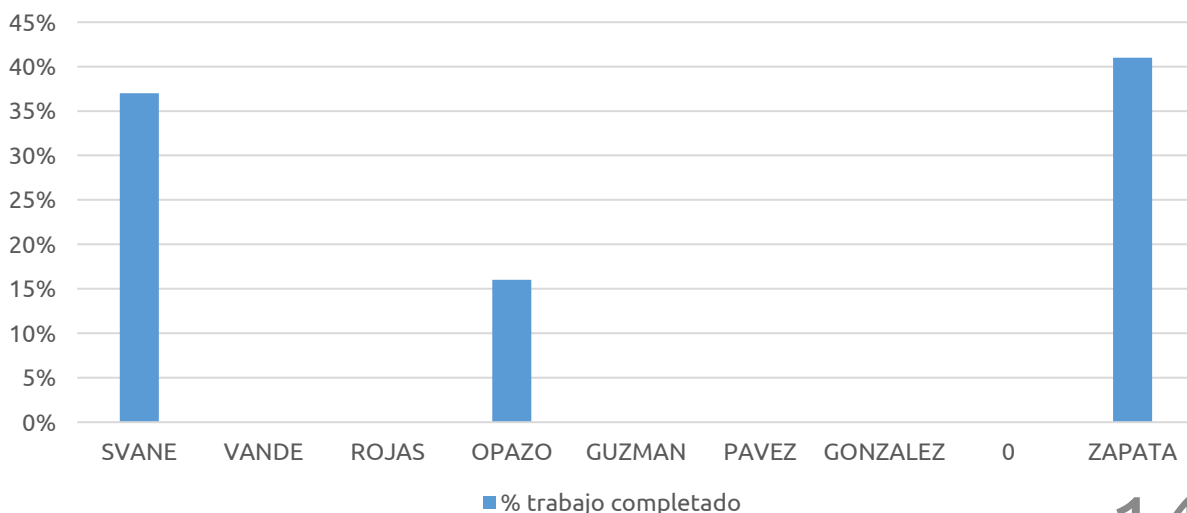

# AVANCE DE PROYECTOS

## Organigrama del proyecto:

- Felipe Van de Wyngard – Gerente
- Jaime Guzmán – Producción Técnica
- Nicolás Pávez – Servicios a Atletas
- Rodrigo Gonzalez – Servicio a Atletas
- Carol Rojas – Administración y Finanzas
- Jaime Opazo – Comunicación y Promoción
- Daniel Rioseco – Asistente de Finanzas
- Gustavo Svane – Director General del Proyecto
- Josefa Martinez – Asesoría en Sustentabilidad



# ESTADO DE TAREAS



## INFORME ESTADO DE TAREAS Asesoría Eventos ITU Chile

Gustavo Svane

Triathlonchile



# ESTADO DE TAREAS

## Copa Santiago 2021

Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
<b>LUGAR DE COMPETENCIA</b>									
Mapa genérico de la sede (Google Earth)	99%	3/9/2020	5/10/2020	GUZMAN;SVANE					
Planificación detallada de sitio	87%	14/9/2020	2/12/2020	SVANE;GUZMAN					
Plan de despliegue de equipamiento FOP	50%	14/9/2020	30/11/2020	GUZMAN					
Plan de configuración de la zona de transición	99%	14/9/2020	30/11/2020	GUZMAN;SVANE					
Plan para motocicletas	92%	14/9/2020	23/10/2020	GUZMAN;SVANE					
Plan de armado de la sede	74%	5/10/2020	8/1/2021	GUZMAN					
Preparaciones para condiciones de calor	25%	14/9/2020	9/12/2020	GUZMAN					
Plan de evaluación de riesgo de ruta	99%	16/9/2020	30/10/2020	GUZMAN					
Visita técnica a sede	74%	18/9/2020	25/1/2021	EQUIPO					
Plan de comunicación		29/9/2020	14/12/2020	GUZMAN;SVANE					
Plan de señalización de ruta	25%	17/9/2020	21/12/2020	GUZMAN					
Plan de acreditación	100%	6/10/2020	30/12/2020	SVANE					
Plan de contingencia	99%	14/9/2020	11/12/2020	SVANE;GUZMAN					
Plan de operación marina	96%	16/9/2020	6/11/2020	GUZMAN;SVANE					
Plan de calidad del agua	50%	16/9/2020	14/12/2020	VANDE					
Actualizaciones del clima / Pronóstico		14/9/2020	14/12/2020	OPAZO					
Plan de servicios VIP	33%	14/9/2020	14/12/2020	ROJAS					
Plan de evacuación		6/11/2020	11/1/2021	GUZMAN;SVANE					
Plan medico	88%	16/9/2020	30/10/2020	GUZMAN;SVANE					
Plan de gestión de tráfico		29/9/2020	18/12/2020	GUZMAN					
Plan de desarmado de la sede		30/10/2020	18/12/2020	GUZMAN					
Plano de vallado y barreras	67%	17/9/2020	30/11/2020	GUZMAN					
Programa diario de actividades de la competencia (DRS)	100%	14/9/2020	9/10/2020	SVANE					
Agenda provisional de eventos	100%	16/9/2020	23/9/2020	SVANE					
<b>ADMINISTRACIÓN</b>									
Estructura comité organizador (COL)	46%	11/9/2020	16/12/2020	VANDE					
Presupuesto global de la serie - Cash Flow	99%	15/9/2020	22/11/2020	ROJAS					
Plan protocolo COVID-19	58%	3/9/2020	31/12/2020	SVANE					
Contrato seguros	50%	29/9/2020	25/12/2020	ROJAS					
Tramitación de permisos avales de Intendencia Metropolitana	80%	17/9/2020	16/12/2020	GUZMAN;VANDE					
Tramitación de permisos avales de Municipalidad Quinta Normal	80%	17/9/2020	16/12/2020	GUZMAN;VANDE					
Tramitación de permisos corte de tránsito SEREMI de Transporte	80%	17/9/2020	16/12/2020	GUZMAN;VANDE					
Tramitación de permisos COCH	80%	17/9/2020	16/12/2020	GUZMAN;VANDE					
Tramitación de permisos corte de tránsito Carabineros	80%	17/9/2020	16/12/2020	GUZMAN;VANDE					
Tramitación de permisos de Armada	80%	14/9/2020	27/11/2020	GUZMAN;VANDE					
Plan de alimentación de atletas	50%	20/10/2020	22/1/2021	PAVEZ					
<b>INFRAESTRUCTURA DE COMPETENCIA</b>									
Equipamiento de competencias	25%	7/9/2020	4/1/2021	GUZMAN					

# ESTADO DE TAREAS

## Copa Santiago 2021

Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
<b>COMUNICACIONES</b>									
Plan de promoción del evento	42%	17/9/2020	22/1/2021	OPAZO					
Contrato con patrocinadores		21/9/2020	4/1/2021	VANDE					
Plan de branding y activación de marcas	32%	19/10/2020	22/1/2021	OPAZO					
Plan de operaciones de medios		20/10/2020	29/1/2021	OPAZO					
<b>RECURSOS HUMANOS</b>									
Plan de formación del personal	25%	22/9/2020	11/12/2020	GUZMAN					
Reclutamiento y tareas de TOs	40%	9/11/2020	28/12/2020	SVANE					
Servicios TOs	40%	2/11/2020	28/12/2020	SVANE					
Boletín de noticias TOs		20/11/2020	18/1/2021	SVANE					
Reclutamiento de voluntarios		29/9/2020	8/1/2021	GUZMAN					
<b>SERVICIOS A DEPORTISTAS</b>									
Plan de servicios para deportistas	49%	21/9/2020	18/12/2020	GONZALEZ;PAVEZ					
Plan de kit de atleta	50%	18/9/2020	15/1/2021	PAVEZ					
Registro de atletas Elite	50%	12/1/2021	22/1/2021	PAVEZ					
Plan de alojamiento atletas Elite	50%	7/12/2020	18/12/2020	PAVEZ					
Plan de control de dopaje		14/12/2020	18/12/2020	VANDE					
Plan armado de briefing		6/11/2020	27/1/2021	PAVEZ					
Plan de entrenamiento de deportistas	50%	17/9/2020	30/11/2020	PAVEZ					
Plan de calculo de oleadas Age Groups	99%	17/9/2020	30/11/2020	GONZALEZ					
<b>IMAGEN DE COMPETENCIA</b>									
Plan de ceremonias de apertura y cierre	52%	9/11/2020	15/1/2021	ROJAS					
Plan de sistema de sonido y video de la sede	90%	21/9/2020	8/1/2021	OPAZO					
Plan de presentación del deporte en sede	14%	21/9/2020	8/1/2021	OPAZO					
<b>TECNOLOGÍA DE COMPETENCIA</b>									
Plan de tiempos y resultados	83%	6/10/2020	30/10/2020	GUZMAN					

	Tarea completada
	Tarea pendiente
	Tarea retrasada

# ESTADO DE TAREAS

## Copa Valdivia 2021

Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
<b>LUGAR DE COMPETENCIA</b>									
Mapa genérico de la sede (Google Earth)	99%	8/10/2020	10/12/2020	ZAPATA					
Planificación detallada de sitio	100%	19/10/2020	13/11/2020	ZAPATA					
Plan de despliegue de equipamiento FOP		12/10/2020	6/11/2020	ZAPATA					
Plan de configuración de la zona de transición	100%	12/10/2020	6/11/2020	ZAPATA					
Plan para motocicletas	100%	12/10/2020	20/11/2020	ZAPATA					
Plan de armado de la sede		5/10/2020	30/10/2020	ZAPATA					
Preparaciones para condiciones de calor		12/10/2020	6/11/2020	ZAPATA					
Plan de evaluación de riesgo de ruta	50%	19/10/2020	6/11/2020	ZAPATA					
Visita técnica a sede		30/11/2020	1/2/2021	ZAPATA					
Plan de comunicación		28/10/2020	9/11/2020	ZAPATA					
Plan de señalización de ruta		20/10/2020	24/11/2020	ZAPATA					
Plan de acreditación		6/10/2020	1/1/2021	ZAPATA					
Plan de contingencia		13/11/2020	11/1/2021	ZAPATA					
Plan de operación marina	67%	19/10/2020	13/11/2020	ZAPATA					
Plan de calidad del agua		19/10/2020	13/11/2020	ZAPATA					
Actualizaciones del clima / Pronóstico		12/10/2020	6/11/2020	ZAPATA					
Plan de servicios VIP	100%	12/10/2020	6/11/2020	ZAPATA					
Plan de evacuación		6/11/2020	13/11/2020	ZAPATA					
Plan medico	50%	19/10/2020	1/12/2020	ZAPATA					
Plan de gestion de trafico		28/10/2020	16/11/2020	ZAPATA					
Plan de desarmado de la sede		28/10/2020	13/11/2020	ZAPATA					
Plano de vallado y barreras	50%	20/10/2020	24/11/2020	ZAPATA					
Programa diario de actividades de la competencia (DRS)	100%	12/10/2020	6/11/2020	SVANE					
Agenda provisional de eventos	100%	19/10/2020	20/11/2020	ZAPATA					
<b>ADMINISTRACIÓN</b>									
Estructura comité organizador (COL)	50%	10/10/2020	13/11/2020	ZAPATA					
Presupuesto global de la serie - Cash Flow		12/10/2020	17/12/2020	ZAPATA					
Plan protocolo COVID-19	38%	8/10/2020	29/1/2021	ZAPATA					
Contrato seguros		28/10/2020	17/11/2020	ZAPATA					
Tramitación de permisos avales de Intendencia y Municipalidad	100%	12/10/2020	22/10/2020	ZAPATA					
Tramitación de permisos corte de tránsito SEREMI y Carabineros	100%	12/10/2020	22/10/2020	ZAPATA					
Tramitación de permisos de Armada	100%	12/10/2020	22/10/2020	ZAPATA					
Plan de alimentación de atletas		20/10/2020	22/11/2020	ZAPATA					
<b>INFRAESTRUCTURA DE COMPETENCIA</b>									
Equipamiento de competencias	50%	9/10/2020	16/12/2020	ZAPATA					

# ESTADO DE TAREAS

## Copa Valdivia 2021

Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO
<b>COMUNICACIONES</b>									
Plan de promoción del evento	50%	19/10/2020	22/11/2020	OPAZO					
Contrato con patrocinadores		19/10/2020	29/10/2020	ZAPATA					
Plan de branding y activación de marcas		19/10/2020	22/11/2020	OPAZO					
Plan de operaciones de medios		20/10/2020	9/11/2020	OPAZO					
<b>RECURSOS HUMANOS</b>									
Plan de formación del personal		2/11/2020	28/12/2020	ZAPATA					
Reclutamiento de voluntarios		23/11/2020	29/1/2021	ZAPATA					
Servicios TOs		9/11/2020	28/12/2020	SVANE					
Boletín de noticias TOs		20/11/2020	18/1/2021	SVANE					
Reclutamiento y tareas de TOs	4%	9/11/2020	28/1/2021	SVANE					
<b>SERVICIOS A DEPORTISTAS</b>									
Plan de servicios para deportistas	73%	19/10/2020	23/12/2020	ZAPATA					
Plan de kit de atleta	99%	19/10/2020	16/12/2020	ZAPATA					
Registro de atletas Elite	100%	20/10/2020	20/11/2020	ZAPATA					
Plan de alojamiento atletas Elite		19/10/2020	30/10/2020	ZAPATA					
Plan de control de dopaje		19/10/2020	23/10/2020	ZAPATA					
Plan armado de briefing		6/11/2020	19/11/2020	ZAPATA					
Plan de entrenamiento de deportistas		19/10/2020	30/10/2020	ZAPATA					
Plan de calculo de oleadas Age Groups		19/10/2020	23/10/2020	ZAPATA					
<b>IMAGEN DE COMPETENCIA</b>									
Plan de ceremonias de apertura y cierre		9/11/2020	23/12/2020	ZAPATA					
Plan de sistema de sonido y video de la sede		19/10/2020	3/12/2020	OPAZO					
Plan de presentación del deporte en sede		19/10/2020	3/12/2020	OPAZO					
<b>TECNOLOGÍA DE COMPETENCIA</b>									
Plan de tiempos y resultados	100%	6/10/2020	30/11/2020	ZAPATA					

Tarea completada

Tarea pendiente

Tarea retrasada

# PROXIMOS PASOS

Profundizar la **Promoción** de los eventos.

Compra de **equipamiento**.

Reuniones con proveedores.

Reuniones con **prensa**.

Reuniones con **organizadores** y **autoridades** de Valdivia y Concepción.

**Visita técnica** a Valdivia y Concepción.

Confirmación de **permisos**.

Triathlon  Chile
