

14SEP2020



INFORME DE GESTIÓN para Comité Ejecutivo FECHITRI

Gustavo Svane

triatlonchile

INDICE

- A. Proyectos
- B. Equipo técnico
- C. Desarrollo del Proyecto
- D. Información general del Proyecto
- E. Visión general de los recursos
- F. Conclusión

A PROYECTOS

ACTUAL

Santiago PATCO Pan American Cup

Fecha: Noviembre 2020

Sede: Santiago, Chile



FUTUROS

Valdivia PATCO Pan American Cup

Fecha: Febrero 2021

Sede: Valdivia, Chile



Concepción PATCO Middle Distance

Fecha: Febrero 2021

Sede: Concepción, Chile

Juegos Panamericanos Santiago 2023

ITU World Cup Chile



B EQUIPO TÉCNICO

Felipe Van de Wyngard – Gerente General

Nicolás Pávez – Gerente Técnico

Jaime Guzmán –Eventos

Carol Rojas – Gerente Administración y Finanzas

Jaime Opazo - Comunicaciones

Rodrigo Gonzalez – Coordinador Técnico

Daniel Rioseco – Asistente de Finanzas

Gustavo Svane – Eventos Internacionales



DESARROLLO DEL PROYECTO

El proyecto se ha segmentado en 8 áreas y 760 tareas:

Áreas de trabajo (primera línea):

- ✓ Lugar de competencia
- ✓ Administración
- ✓ Infraestructura de competencia
- ✓ Comunicaciones
- ✓ Servicios a deportistas
- ✓ Imagen de competencia
- ✓ Recursos humanos
- ✓ Tecnología de competencia

54 tareas (segunda línea)

706 subtareas (tercera línea)

Cada tarea ha sido asignada a un miembro del [Equipo Técnico](#)



DESARROLLO DEL PROYECTO

Nombre de tarea	% completado	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos asignados
LUGAR DE COMPETENCIA		jue 3/9/20	vie 20/11/20	
Mapa genérico de la sede (Google Earth)	20%	jue 3/9/20	mié 30/9/20	SVANE;GUZMAN
Preparaciones para condiciones de calor	25%	mié 9/9/20	vie 9/10/20	SVANE;GUZMAN
Plan para motocicletas	80%	mié 9/9/20	vie 23/10/20	SVANE
Plan de contingencia	43%	jue 10/9/20	lun 12/10/20	SVANE;GUZMAN
Plan de operación marina	25%	vie 11/9/20	mar 13/10/20	SVANE;GUZMAN
Plan de calidad del agua	25%	vie 11/9/20	mar 13/10/20	VANDE
Plan medico	25%	vie 11/9/20	vie 30/10/20	SVANE;GUZMAN
Plan de evaluación de riesgo de ruta	25%	vie 11/9/20	lun 19/10/20	GUZMAN
Planificación detallada de sitio		lun 14/9/20	vie 9/10/20	SVANE;GUZMAN
Actualizaciones del clima / Pronóstico		lun 14/9/20	vie 9/10/20	OPAZO
Plan de servicios VIP		lun 14/9/20	vie 9/10/20	ROJAS
Plan de configuración de la zona de transición		lun 14/9/20	vie 9/10/20	SVANE;GUZMAN
Plan de despliegue de equipamiento FOP		lun 14/9/20	vie 9/10/20	GUZMAN
Programa diario de actividades de la competencia (DRS)		lun 14/9/20	vie 9/10/20	SVANE
Agenda provisional de eventos		mié 16/9/20	mié 23/9/20	SVANE;GUZMAN
Plan de armado de la sede		jue 17/9/20	mié 30/9/20	GUZMAN
Plan de señalización de ruta		jue 17/9/20	vie 23/10/20	GUZMAN
Plano de vallado y barreras		jue 17/9/20	vie 23/10/20	GUZMAN
Visita técnica a sede		vie 18/9/20	vie 20/11/20	Todo Equipo
Plan de comunicación		mar 29/9/20	vie 9/10/20	SVANE;GUZMAN
Plan de gestion de trafico		mar 29/9/20	vie 16/10/20	GUZMAN
Plan de desarmado de la sede		mié 30/9/20	vie 16/10/20	GUZMAN
Plan de acreditacion		mar 6/10/20	vie 23/10/20	SVANE
Plan de evacuación		vie 6/11/20	vie 13/11/20	SVANE;GUZMAN
ADMINISTRACIÓN		jue 3/9/20	dom 22/11/20	
Plan protocolo COVID-19	65%	jue 3/9/20	vie 2/10/20	SVANE
Estructura comité organizador (COL)	12%	vie 11/9/20	vie 16/10/20	VANDE
Tramitación de permisos avals de Gobiernos		lun 14/9/20	jue 24/9/20	GUZMAN;VANDE
Tramitación de permisos corte de tránsito		lun 14/9/20	jue 24/9/20	GUZMAN;VANDE
Tramitación de permisos de prefectura naval		lun 14/9/20	jue 24/9/20	GUZMAN;VANDE
Presupuesto global de la serie - Cash Flow		mar 15/9/20	dom 22/11/20	ROJAS
Contrato seguros		mar 29/9/20	lun 19/10/20	ROJAS
Plan de alimentación de atletas		mar 20/10/20	dom 22/11/20	RIOSECO
INFRAESTRUCTURA DE COMPETENCIA		lun 7/9/20	vie 13/11/20	
Equipamiento de competencias	27%	lun 7/9/20	vie 13/11/20	GUZMAN
COMUNICACIONES		jue 17/9/20	mar 22/12/20	
Plan de promoción del evento		jue 17/9/20	dom 22/11/20	OPAZO
Contrato con patrocinadores		lun 21/9/20	jue 29/10/20	VANDE
Plan de branding y activación de marcas		lun 19/10/20	mar 22/12/20	OPAZO
Plan de operaciones de medios		mar 20/10/20	lun 9/11/20	OPAZO
SERVICIOS A DEPORTISTAS		jue 17/9/20	vie 20/11/20	
Plan de entrenamiento de deportistas		jue 17/9/20	mié 30/9/20	PAVEZ
Plan de calculo de oleadas Age Groups		jue 17/9/20	mié 23/9/20	GONZALEZ
Plan de kit de atleta		vie 18/9/20	mié 18/11/20	PAVEZ
Plan de servicios para deportistas		lun 21/9/20	vie 13/11/20	GUZMAN;GONZALEZ;PAVEZ
Plan de alojamiento atletas Elite		mar 22/9/20	lun 5/10/20	PAVEZ
Plan de control de dopaje		mar 22/9/20	lun 28/9/20	VANDE
Registro de atletas Elite		mar 20/10/20	vie 20/11/20	PAVEZ
Plan armado de briefing		vie 6/11/20	jue 19/11/20	PAVEZ
IMAGEN DE COMPETENCIA		lun 21/9/20	dom 22/11/20	
Plan de sistema de sonido y ideo de la sede		lun 21/9/20	vie 6/11/20	OPAZO
Plan de presentación del deporte en sede		lun 21/9/20	vie 6/11/20	OPAZO
Plan de ceremonias de apertura y cierre		lun 9/11/20	vie 13/11/20	ROJAS
RECURSOS HUMANOS		mar 22/9/20	lun 9/11/20	
Plan de formación del personal		mar 22/9/20	vie 2/10/20	GUZMAN
Reclutamiento de voluntarios		mar 29/9/20	lun 9/11/20	GUZMAN
Reclutamiento y tareas de TOs		lun 5/10/20	jue 15/10/20	SVANE
Servicios TOs		lun 19/10/20	vie 23/10/20	SVANE
Boletín de noticias TOs		lun 26/10/20	vie 6/11/20	SVANE
TECNOLOGÍA DE COMPETENCIA		mar 6/10/20	vie 30/10/20	
Plan de tiempos y resultados		mar 6/10/20	vie 30/10/20	GUZMAN


D INFORMACION DEL PROYECTO

% COMPLETADO

15%

% COMPLETADO


Estado de todas las tareas de nivel superior.

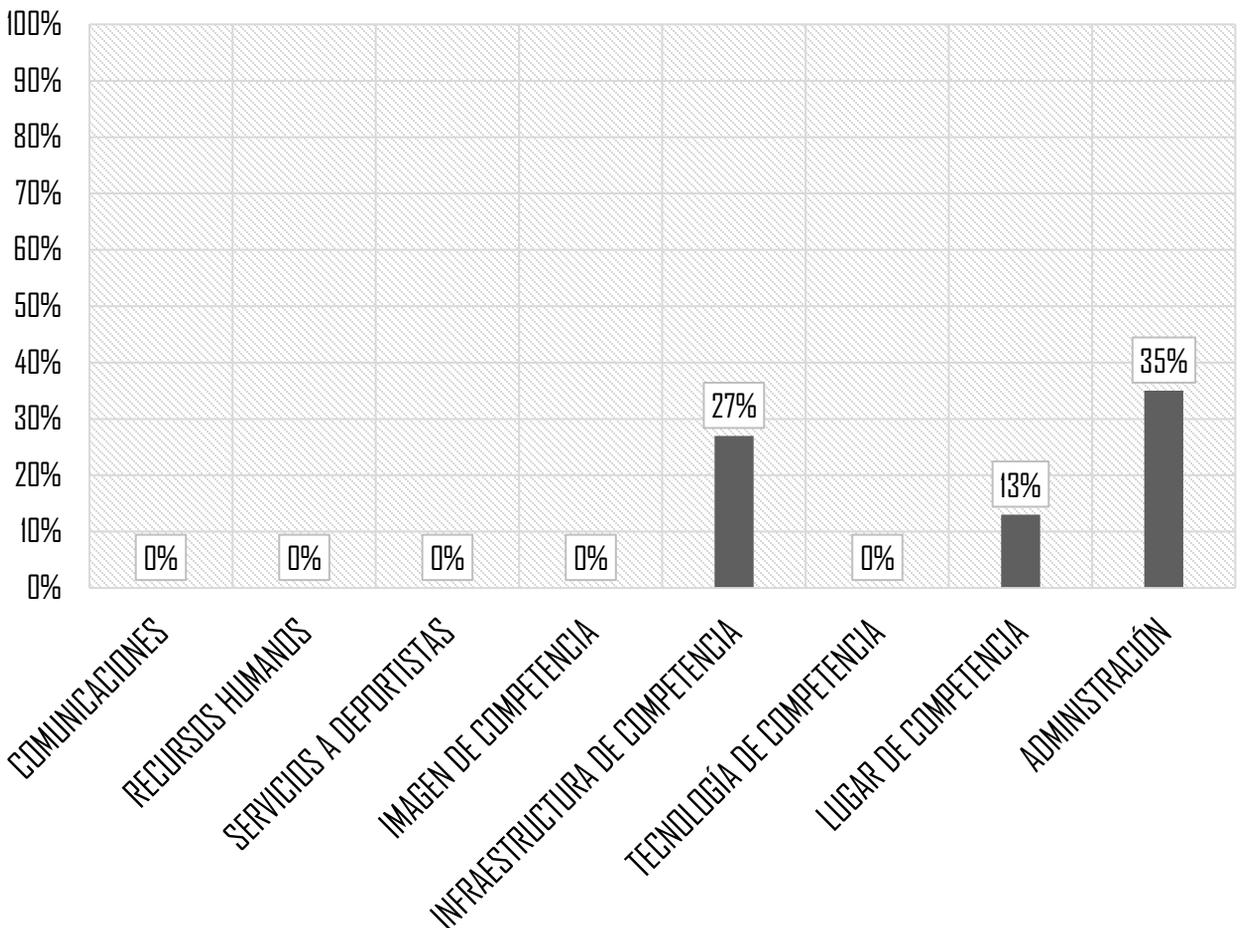

VISIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS


ESTADÍSTICAS DE RECURSOS

Estado de trabajo de todos los recursos de trabajo.

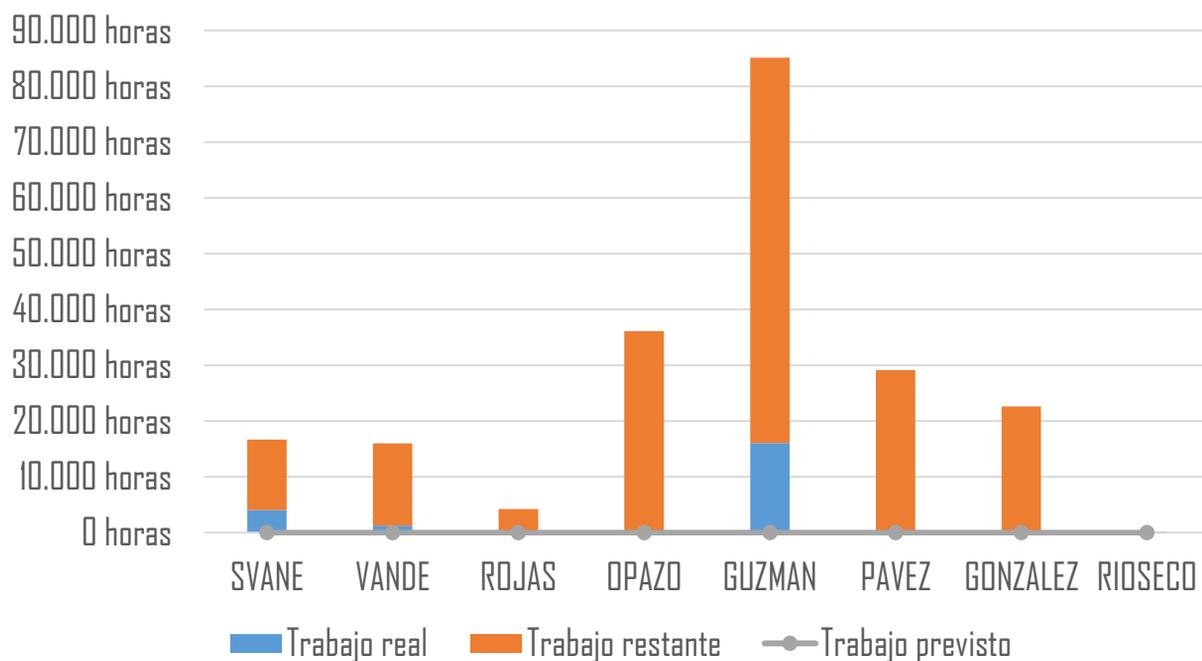

ESTADO DEL TRABAJO

% trabajo realizado por todos los recursos de trabajo.

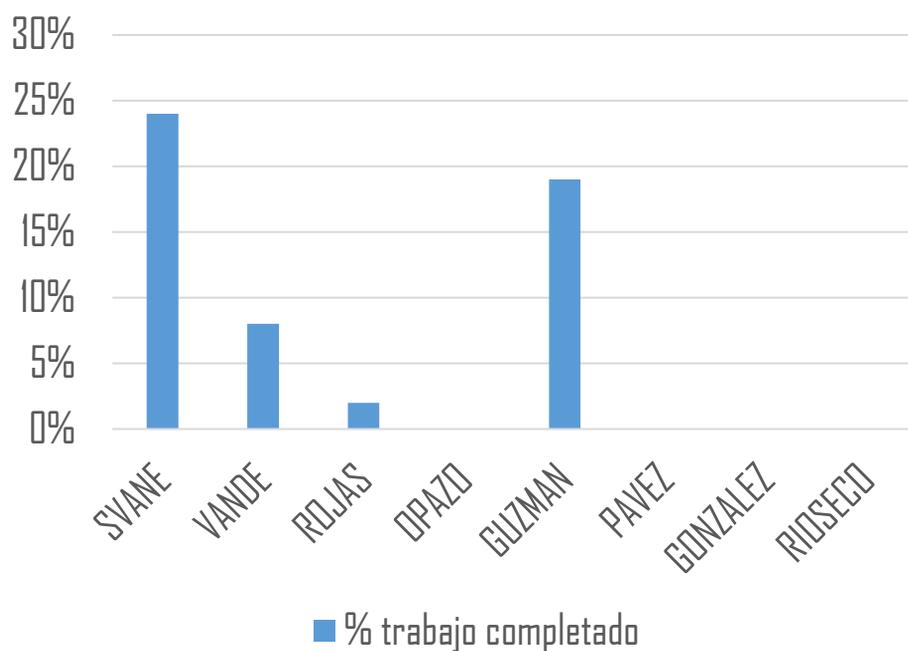

VISIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS

ESTADO DE LOS RECURSOS

Trabajo restante para todos los recursos de trabajo

NOMBRE	COMIENZO	FIN	TRABAJO RESTANTE
SVANE	jue 3/9/20	vie 20/11/20	12.662 horas
VANDE	vie 11/9/20	vie 20/11/20	14.768 horas
ROJAS	lun 14/9/20	dom 22/11/20	4.171,69 horas
OPAZO	lun 14/9/20	mar 22/12/20	36.112 horas
GUZMAN	jue 3/9/20	vie 20/11/20	69.070, horas
PAVEZ	jue 17/9/20	vie 20/11/20	29.136 horas
GONZALEZ	jue 17/9/20	vie 20/11/20	22.640 horas
RIOSECO	mar 20/10/20	dom 22/11/20	200 horas



CONCLUSIÓN

Próximos pasos

- ✓ Profundizar las tareas de gestión técnica de la competencia.
- ✓ Comenzar tareas de tramitación de permisos y confección de seguros.
- ✓ Valorización de las tareas según presupuesto IND.
- ✓ Comienzo de promoción de los proyectos.
- ✓ Planificación de formación de recursos humanos.





triatlonchile
